

OFICIO Nº 304/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 08 de julho de 2026.

À Senhora  
**Nara da Silva Macedo**  
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição do 1º termo aditivo de serviços de construção de U.E. de 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Riacho Fundo, município de Chapadina, executados pela Empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**Senhora Secretária,**

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **3ª medição** do 1º termo aditivo de serviços executados pela empresa **Nascimento Construções e Serviços LTDA**, sob nº CNPJ: 40.899.116/0001-29, referente a serviços de **construção de U.E. de 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Riacho Fundo, município de Chapadina**, Conforme:

**Contrato** nº 125/2025,

**Proc. Adm.** nº 0556/2025

**Concorrência** nº 007/2025,


**NF** nº 02,

**Valor** R\$ 308.248,55

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO  
EM 08/07/26  
HORÁRIO: 15:03  
  
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



Ilmo. Senhor

**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinha-MA

A empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES ES SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 40.899.116/0001-29**, vem requerer a Vossa Senhoria a confirmação da medição dos serviços já executados, **REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME O PROJETO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA U. E DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVO RIACHO FUNDO EM CHAPADINHA/MA, MEDIANTE O CONTRATO ADM Nº 125/2025, PROC. ADM Nº 0556/2025**, segue fotos dos serviços realizados em anexo.

São Luís - MA, em 19 de junho de 2026.

Atenciosamente,

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES ES SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

---





CONCORRÊNCIA Nº 001/2014  
PROCESSO Nº 001/2014  
EMPRESA: NACVIMTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026**



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA: Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026

**PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL**

DATA: 29/05/2025

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |        |           | 2ª MEDIÇÃO |       |       | 3ª MEDIÇÃO |       |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|         |                                                                                                                                             |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT  | VALOR     | %          | QUANT | VALOR | %          | QUANT | VALOR |
| 4.1.2   | SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO                                                                                                                   |      |                   |                    | 22.253,02       | 100,00%    |        | 22.253,02 |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE GORRIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024                                         | M2   | 26,88             | 38,49              | 1.034,61        | 100%       | 26,88  | 1.034,61  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.2 | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                 | M2   | 78,22             | 44,93              | 3.514,42        | 100%       | 78,22  | 3.514,42  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                        | KG   | 71,60             | 20,24              | 1.449,18        | 100%       | 71,60  | 1.449,18  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                        | KG   | 242,70            | 17,20              | 4.174,44        | 100%       | 242,70 | 4.174,44  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                       | KG   | 232,90            | 15,22              | 3.544,74        | 100%       | 232,90 | 3.544,74  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.6 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3   | 9,32              | 643,90             | 6.001,15        | 100%       | 9,32   | 6.001,15  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                | M3   | 9,32              | 271,94             | 2.534,48        | 100%       | 9,32   | 2.534,48  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.3   | VIGA BALDRAME                                                                                                                               |      |                   |                    | 19.804,97       | 100,00%    |        | 19.804,97 |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.3.1 | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                      | M2   | 100,84            | 70,84              | 7.143,51        | 100%       | 100,84 | 7.143,51  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                        | KG   | 98,95             | 20,24              | 2.002,75        | 100%       | 98,95  | 2.002,75  |            |       |       |            |       |       |
| 4.1.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                        | KG   | 263,02            | 17,20              | 4.523,94        | 100%       | 263,02 | 4.523,94  |            |       |       |            |       |       |



NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

CONCORRÊNCIA: Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026

## PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL

DATA: 29/05/2025

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |        |           |   | 2ª MEDIÇÃO |       |   |       | 3ª MEDIÇÃO |   |       |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|---|------------|-------|---|-------|------------|---|-------|-------|
|         |                                                                                                                                                     |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT  | VALOR     | % | QUANT      | VALOR | % | QUANT | VALOR      | % | QUANT | VALOR |
| 4.1.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                                                                               | KG   | 52,80             | 15,22              | 803,62          | 100%       | 52,80  | 803,62    |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 4.1.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024                             | KG   | 114,00            | 11,96              | 1.363,44        | 100%       | 114,00 | 1.363,44  |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 4.1.3.6 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024               | M3   | 5,33              | 744,41             | 3.967,71        | 100%       | 5,33   | 3.967,71  |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 4.2     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                   |      |                   |                    |                 |            |        |           |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 4.2.1   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | M2   | 94,45             | 25,04              | 2.365,03        | 100,00%    |        | 2.365,03  |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5       | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                      |      |                   |                    |                 |            |        |           |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5.1     | PILARES                                                                                                                                             |      |                   |                    |                 |            |        |           |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5.1.1   | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                            | M2   | 166,55            | 64,21              | 10.694,18       | 100%       | 166,55 | 10.694,18 |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5.1.2   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022     | KG   | 237,65            | 20,68              | 4.914,60        | 100%       | 237,65 | 4.914,60  |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5.1.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022                        | KG   | 606,03            | 12,56              | 7.611,74        | 100%       | 606,03 | 7.611,74  |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5.1.4   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022                        | KG   | 47,90             | 10,62              | 508,70          | 100%       | 47,90  | 508,70    |   |            |       |   |       |            |   |       |       |
| 5.1.5   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022                       | M3   | 8,32              | 853,28             | 7.031,29        | 100%       | 8,32   | 7.031,29  |   |            |       |   |       |            |   |       |       |

X





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO

**CONCORRÊNCIA:** Nº 07/2025 CONTRATO: 116/0001-29

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/02/2025

**TEMPO DE REFERENCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026**







CNPJ: 40.899.116/0001-29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO

**CONCORRÊNCIA:** Nº 07/2025 CONTRA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/2025 CON IRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 27/02/2026 à 19/06/2026

[illegible]





| PLANILHA DE LAVANTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                        | CUSTO DO CONTRATO |



NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

CONCORRÊNCIA: Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026

**PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL**

DATA: 29/05/2025

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |       |       | 2ª MEDIÇÃO |       |          | 3ª MEDIÇÃO |       |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                          |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT | VALOR | %          | QUANT | VALOR    | %          | QUANT | VALOR    |
| 8.4.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024                                                                                                   | UN   | 43,00             | 26,36              | 1.133,48        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 43,00 | 1.133,48 |
| 8.4.5 | ARANDELA EXTERNA PARA PAREDE EM ALUMÍNIO DOIS FOCOS, COR PRETA, MEDIDAS 12 X 8 X 4,5 CM, PARA LÂMPARA EM LED G9 HALOPIN 60W 127V                                                                         | UN   | 2,00              | 98,96              | 197,92          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 2,00  | 197,92   |
| 9     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                  |      |                   |                    |                 |            |       |       |            |       |          |            |       |          |
| 9.1   | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                    | PT   | 16,00             | 242,38             | 6.319,00        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -     | -        |
| 9.2   | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                       | UN   | 1,00              | 317,94             | 317,94          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -     | -        |
| 9.3   | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024                            | UN   | 2,00              | 34,41              | 68,82           |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 2,00  | 68,82    |
| 9.4   | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2026 | UN   | 2,00              | 18,07              | 36,14           |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 2,00  | 36,14    |
| 9.5   | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021                                                                                                               | UN   | 1,00              | 34,38              | 34,38           |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 1,00  | 34,38    |
| 9.6   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022                                                                                                        | M    | 96,00             | 4,99               | 479,04          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 96,00 | 479,04   |
| 9.7   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022                                                                                          | M    | 12,00             | 17,37              | 208,44          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 12,00 | 208,44   |
| 9.8   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022                                                                                  | UN   | 16,00             | 8,42               | 134,72          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 16,00 | 134,72   |
| 9.9   | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022                                                                                           | UN   | 12,00             | 9,01               | 108,12          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 12,00 | 108,12   |
| 9.10  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016   | UN   | 2,00              | 24,31              | 48,62           |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 2,00  | 48,62    |
| 9.11  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022                                                                                               | M    | 36,00             | 15,47              | 556,92          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 36,00 | 556,92   |
| 9.12  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022                                                                                   | UN   | 18,00             | 6,52               | 117,36          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 18,00 | 117,36   |
| 9.13  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4")                                                                                                                                                                  | UN   | 6,00              | 55,07              | 330,42          |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 6,00  | 330,42   |
| 10    | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                   |      |                   |                    |                 |            |       |       |            |       |          |            |       |          |
| 10.1  | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                     | PT   | 16,00             | 224,58             | 3.593,28        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 16,00 | 3.593,28 |
|       |                                                                                                                                                                                                          |      |                   |                    | 15.581,63       |            |       |       |            |       | 6.966,01 |            |       | 8.615,62 |
|       |                                                                                                                                                                                                          |      |                   |                    | 3.593,28        |            |       |       |            |       | -        |            |       | 3.593,28 |





| PLANILHA DE LAVANTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                        | CUSTO DO CONTRATO |



NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

CONCORRÊNCIA: Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026

## PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL

DATA: 29/05/2025

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |          |           | 2ª MEDIÇÃO |        |           | 3ª MEDIÇÃO |        |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                   |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT    | VALOR     | %          | QUANT  | VALOR     | %          | QUANT  | VALOR     |
| 11.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                      | UN   | 7,00              | 75,04              | 525,28          |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 7,00   | 525,28    |
| 11.11 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                      | UN   | 1,00              | 179,62             | 179,62          |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 1,00   | 179,62    |
| 11.12 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM                                                                                                                                         | M2   | 2,50              | 530,73             | 1.326,83        |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 2,50   | 1.326,83  |
| 11.13 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM                                                                                                                                                  | M2   | 18,00             | 452,03             | 7.232,48        |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 18,00  | 7.232,48  |
| 12    | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                 |      |                   |                    | 2.039,07        |            | -        | -         |            | -      | 1.520,00  |            | -      | 519,07    |
| 12.1  | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO          | PT   | 8,00              | 190,00             | 1.520,00        |            | -        | -         | 100%       | 190,00 | 1.520,00  |            | -      | -         |
| 12.2  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2024                                                                           | UN   | 8,00              | 17,70              | 141,60          |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 8,00   | 141,60    |
| 12.3  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADADA, 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)        | UN   | 1,00              | 16,76              | 16,76           |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 1,00   | 16,76     |
| 12.4  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020. PE                                                                     | UN   | 1,00              | 243,77             | 243,77          |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 1,00   | 243,77    |
| 12.5  | PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM                                                                                                                            | UN   | 6,00              | 19,49              | 116,94          |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 6,00   | 116,94    |
| 13    | PISO                                                                                                                                                                              |      |                   |                    | 53.538,59       |            | -        | -         |            | -      | -         |            | -      | -         |
| 13.1  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM                                                                                                                                         | M2   | 366,07            | 43,42              | 15.894,76       |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 366,07 | 15.894,76 |
| 13.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023. PE                                     | M2   | 272,56            | 69,79              | 19.021,96       |            | -        | -         | 100%       | -      | -         |            | -      | -         |
| 13.3  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022                                    | M3   | 4,90              | 765,29             | 3.847,92        |            | -        | -         |            | -      | -         |            | -      | -         |
| 13.4  | SOLERA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM                                                                                                                            | M    | 19,00             | 120,25             | 2.284,75        |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 19,00  | 2.284,75  |
| 13.5  | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE                                                                                                                                                | M2   | 93,51             | 133,56             | 12.489,20       |            | -        | -         |            | -      | -         |            | 93,51  | 12.489,20 |
| 14    | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                      |      |                   |                    | 93.566,15       | 11,65%     | -        | -         | 100%       | 93,51  | 12.489,20 |            | -      | -         |
| 14.1  | CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2   | 1.460,94          | 7,48               | 10.927,83       | 52,80%     | -        | -         |            | -      | -         |            | -      | -         |
| 14.2  | EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE SMP E UMP, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024           | M2   | 266,96            | 32,90              | 8.782,98        | 100%       | 1.460,94 | 10.927,83 |            | -      | -         |            | -      | -         |
|       |                                                                                                                                                                                   |      |                   |                    | 8.782,98        |            | -        | -         | 100%       | 32,90  | 8.782,98  |            | -      | -         |





| PLANILHA DE LAVANTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                        | CUSTO DO CONTRATO |

[illegible]



NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA: Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026

**PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL**

DATA: 29/05/2025

| ITEM   | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                               | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |       |       | 2ª MEDIÇÃO |       |          | 3ª MEDIÇÃO |        |           |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|-------|----------|------------|--------|-----------|
|        |      |                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT | VALOR | %          | QUANT | VALOR    | %          | QUANT  | VALOR     |
| 16.2.3 |      | BASCULANTE EM ALUMÍNIO COR NPB, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PINTANTE, EXCLUSIVE VIDRO                                                                                           | 4,40              | 440,81             | 1.939,56        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 4,40   | 1.939,56  |
| 16.2.4 | M2   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E-8MM, COLOCADO                                                                                                                                         | 4,40              | 280,98             | 1.236,31        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 4,40   | 1.236,31  |
| 16.3   |      | GRADES                                                                                                                                                                                  | 4,40              |                    | 5.173,88        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -      | 5.173,88  |
| 16.3.1 | M2   | GRADE EM METALON                                                                                                                                                                        | 17,56             | 294,64             | 5.173,88        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -      | 5.173,88  |
| 17     |      | PINTURA                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                 |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -      | -         |
| 17.1   |      | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                                         |                   |                    | 43.395,47       |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -      | -         |
| 17.1.1 | M2   | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023                                                                                                               | 846,65            | 3,85               | 28.083,38       | 10,59%     | -     | -     |            | -     | 4.596,82 |            | 17,56  | 5.173,88  |
| 17.1.2 | M2   | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023                                                                                              | 846,65            | 15,90              | 13.481,74       | 100%       | -     | -     |            | -     | 3.259,60 |            | -      | 38.796,65 |
| 17.1.3 | M2   | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023                                                                                                    | 846,65            | 13,42              | 11.362,04       |            | -     | -     |            | -     | 3.259,60 |            | -      | 24.823,78 |
| 17.2   |      | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                                         |                   |                    |                 |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -      | -         |
| 17.2.1 | M2   | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023                                                                                                               | 347,33            | 3,85               | 1.337,22        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 846,65 | 13.461,74 |
| 17.2.2 | M2   | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023                                                                                              | 347,33            | 15,90              | 5.522,55        | 100%       | -     | -     |            | -     | 1.337,22 |            | 846,65 | 11.362,04 |
| 17.2.3 | M2   | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023                                                                                                    | 347,33            | 13,42              | 4.661,17        |            | -     | -     |            | -     | 1.337,22 |            | -      | 10.183,72 |
| 17.3   |      | PINTURA EM ESQUADRIAS                                                                                                                                                                   |                   |                    |                 |            | -     | -     |            | -     | -        |            | -      | -         |
| 17.3.1 | M2   | PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO                                              | 51,97             | 26,30              | 1.366,81        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 347,33 | 5.522,55  |
| 17.3.2 | M2   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020 | 92,26             | 46,39              | 2.424,34        |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 51,97  | 4.661,17  |
|        |      |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                 |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 51,97  | 3.791,15  |
|        |      |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                 |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 51,97  | 1.966,81  |
|        |      |                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                 |            | -     | -     |            | -     | -        |            | 52,26  | 2.424,34  |



NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA: Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 19/06/2026

**PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTA FINAL**

DATA: 29/05/2025

| ITEM                                                                                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |       |            | 2ª MEDIÇÃO |       |            | 3ª MEDIÇÃO |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT | VALOR      | %          | QUANT | VALOR      | %          | QUANT | VALOR      |
| 18                                                                                              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                               |      |                   |                    |                 |            |       |            |            |       |            |            |       |            |
| 18.1                                                                                            | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)                                                                                                                                                                                                   | M2   | 4,04              | 565,75             | 8.628,12        |            | -     | -          |            | -     | -          |            | -     | -          |
| 18.2                                                                                            | LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM                                                                                                                                                                                                             | UN   | 14,00             | 205,05             | 2.870,70        |            | -     | -          |            | -     | -          |            | -     | -          |
| 18.3                                                                                            | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. MONTAGEM EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2   | 5,52              | 614,31             | 3.390,99        |            | -     | -          |            | -     | -          |            | -     | -          |
| 19                                                                                              | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |            |       |            |            |       |            |            |       |            |
| 19.1                                                                                            | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 391,25            | 2,10               | 821,63          |            | -     | -          |            | -     | -          |            | -     | -          |
| 19.2                                                                                            | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M                                                                                                                                                                                                | UN   | 1,00              | 273,96             | 273,96          |            | -     | -          |            | -     | -          |            | -     | -          |
| VALOR ORÇAMENTO:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    | 687.766,99      |            |       | 231.144,01 |            |       | 217.206,63 |            |       | 239.416,35 |
| VALOR BDI TOTAL:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    | 197.733,01      |            |       | 66.453,90  |            |       | 62.446,91  |            |       | 68.832,20  |
| VALOR TOTAL:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    | 885.500,00      |            |       | 297.597,91 |            |       | 279.653,54 |            |       | 308.248,55 |
| SALDO DA OBRA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    | 0,00            |            |       | 33,61%     |            |       | 31,58%     |            |       | 34,81%     |
| TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |            |       |            |            |       |            |            |       |            |
| TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |            |       |            |            |       |            |            |       |            |
| TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |            |       |            |            |       |            |            |       |            |
| VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 308.248,55 (Trezentos e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Centavos) |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |            |       |            |            |       |            |            |       |            |

Lucas Euzébio Maciel  
Engenheiro Civil  
CREA 1116770288



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DIFERENTES DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556472025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 27/06/2026

| PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL |                                                                                                                                                |                   |               |                    |                 |         |          |            |        |       |            |        |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|----------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|-----------|
| DATA: 22/06/2026                                                                 |                                                                                                                                                | CUSTO DO CONTRATO |               |                    | 1ª MEDIÇÃO      |         |          | 2ª MEDIÇÃO |        |       | 3ª MEDIÇÃO |        |       |           |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | UNID              | QUANTIDADE DE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %       | QUANT    | VALOR      | %      | QUANT | VALOR      | %      | QUANT | VALOR     |
| 1                                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                          |                   |               |                    | 23.811,85       | 100,00% |          | 23.811,85  |        |       |            |        |       |           |
| 1.1                                                                              | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,30 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA                    | UN                | 1,00          | 724,58             | 724,58          | 100%    | 1,00     | 724,58     |        |       |            |        |       |           |
| 1.2                                                                              | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM                               | M2                | 1.000,00      | 5,60               | 5.600,00        | 100%    | 1.000,00 | 5.600,00   |        |       |            |        |       |           |
| 1.3                                                                              | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                         | M2                | 391,25        | 6,74               | 2.637,03        | 100%    | 391,25   | 2.637,03   |        |       |            |        |       |           |
| 1.4                                                                              | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                                                                        | UN                | 1,00          | 1.619,64           | 1.619,64        | 100%    | 1,00     | 1.619,64   |        |       |            |        |       |           |
| 1.5                                                                              | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                                | UN                | 1,00          | 1.286,69           | 1.286,69        | 100%    | 1,00     | 1.286,69   |        |       |            |        |       |           |
| 1.6                                                                              | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS                                        | UN                | 1,00          | 11.743,71          | 11.743,71       | 100%    | 1,00     | 11.743,71  |        |       |            |        |       |           |
| 2                                                                                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                            |                   |               |                    | 33.994,32       | 33,33%  |          | 11.330,31  | 33,33% |       | 11.330,31  | 33,33% |       | 11.333,71 |
| 2.1                                                                              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                            | MES               | 6,00          | 5.665,72           | 33.994,32       | 33,33%  | 2,00     | 11.330,31  | 33,33% | 2,00  | 11.330,31  | 33,33% | 2,00  | 11.333,71 |
| 3                                                                                | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                          |                   |               |                    | 8.613,06        | 100,00% |          | 8.613,06   |        |       |            |        |       |           |
| 3.1                                                                              | AF 02/2021                                                                                                                                     | M3                | 26,23         | 79,91              | 2.096,04        | 100%    | 26,23    | 2.096,04   |        |       |            |        |       |           |
| 3.2                                                                              | AF 02/2021                                                                                                                                     | M3                | 22,68         | 79,91              | 1.812,36        | 100%    | 22,68    | 1.812,36   |        |       |            |        |       |           |
| 3.3                                                                              | AF 08/2023                                                                                                                                     | M3                | 195,62        | 24,05              | 4.704,66        | 100%    | 195,62   | 4.704,66   |        |       |            |        |       |           |
| 4                                                                                | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                 |                   |               |                    | 52.766,26       | 100,00% |          | 52.766,26  |        |       |            |        |       |           |
| 4.1                                                                              | FUNDAÇÕES                                                                                                                                      |                   |               |                    | 50.401,23       | 100,00% |          | 50.401,23  |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.1                                                                            | ALICERCE                                                                                                                                       |                   |               |                    | 8.343,24        | 100,00% |          | 8.343,24   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.1.1                                                                          | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS                                                              | M3                | 26,23         | 318,08             | 8.343,24        | 100%    | 26,23    | 8.343,24   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2                                                                            | SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO                                                                                                                      |                   |               |                    | 22.253,02       | 100,00% |          | 22.253,02  |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.1                                                                          | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024                                            | M2                | 26,88         | 38,49              | 1.034,61        | 100%    | 26,88    | 1.034,61   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.2                                                                          | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                    | M2                | 78,22         | 44,93              | 3.514,42        | 100%    | 78,22    | 3.514,42   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.3                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                            | KG                | 71,60         | 20,24              | 1.449,18        | 100%    | 71,60    | 1.449,18   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.4                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                            | KG                | 242,70        | 17,20              | 4.174,44        | 100%    | 242,70   | 4.174,44   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.5                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                           | KG                | 232,90        | 15,22              | 3.544,74        | 100%    | 232,90   | 3.544,74   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.6                                                                          | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | M3                | 9,32          | 643,90             | 6.001,15        | 100%    | 9,32     | 6.001,15   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.2.7                                                                          | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015                                                    | M3                | 9,32          | 271,94             | 2.534,48        | 100%    | 9,32     | 2.534,48   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.3                                                                            | VIGA BALDRAME                                                                                                                                  |                   |               |                    | 19.804,97       | 100,00% |          | 19.804,97  |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.3.1                                                                          | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                         | M2                | 100,84        | 70,84              | 7.143,51        | 100%    | 100,84   | 7.143,51   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.3.2                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                            | KG                | 98,95         | 20,24              | 2.002,75        | 100%    | 98,95    | 2.002,75   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.3.3                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                            | KG                | 263,02        | 17,20              | 4.523,94        | 100%    | 263,02   | 4.523,94   |        |       |            |        |       |           |
| 4.1.3.4                                                                          | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024                                                                           | KG                | 52,80         | 15,22              | 803,62          | 100%    | 52,80    | 803,62     |        |       |            |        |       |           |

2



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE ÁGUA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 135/2025 PROCESSO Nº 05567/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 22/06/2026

PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL

| CUSTO DO CONTRATO |         |                                                                                                                                                      |      | 1ª MEDIÇÃO |                    |                 | 2ª MEDIÇÃO |        |           | 3ª MEDIÇÃO |       |          |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|----------|
| DATA: 22/06/2026  | ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT  | VALOR     | %          | QUANT | VALOR    |
|                   | 4.1.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_02/2022                                | KG   | 114,00     | 11,96              | 1.363,44        | 100%       | 114,00 | 1.363,44  | -          | -     | -        |
|                   | 4.1.3.6 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024                  | M3   | 5,33       | 744,41             | 3.967,71        | 100%       | 5,33   | 3.967,71  | -          | -     | -        |
|                   | 4.2     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                    |      |            | 2.365,03           |                 | 100,00%    |        | 2.365,03  |            |       |          |
|                   | 4.2.1   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | M2   | 94,45      | 25,04              | 2.365,03        | 100%       | 94,45  | 2.365,03  | -          | -     | -        |
|                   | 5       | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                       |      |            | 62.490,82          |                 | 97,11%     |        | 60.687,33 |            |       | 1.803,29 |
|                   | 5.1     | PILARES                                                                                                                                              |      |            | 31.660,51          |                 | 100,00%    |        | 31.660,51 |            |       |          |
|                   | 5.1.1   | FORMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                              | M2   | 166,55     | 64,21              | 10.694,18       | 100%       | 166,55 | 10.694,18 | -          | -     | -        |
|                   | 5.1.2   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022       | KG   | 237,65     | 20,68              | 4.914,60        | 100%       | 237,65 | 4.914,60  | -          | -     | -        |
|                   | 5.1.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022                          | KG   | 606,03     | 12,56              | 7.611,74        | 100%       | 606,03 | 7.611,74  | -          | -     | -        |
|                   | 5.1.4   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022                          | KG   | 47,90      | 10,62              | 508,70          | 100%       | 47,90  | 508,70    | -          | -     | -        |
|                   | 5.1.5   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK-25 MPa, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CARGO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022                        | M3   | 8,32       | 953,28             | 7.931,29        | 100%       | 8,32   | 7.931,29  | -          | -     | -        |
|                   | 5.2     | VIGAS                                                                                                                                                |      |            | 24.941,32          |                 | 100,00%    |        | 24.941,32 |            |       |          |
|                   | 5.2.1   | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                               | M2   | 123,38     | 59,10              | 7.291,76        | 100%       | 123,38 | 7.291,76  | -          | -     | -        |
|                   | 5.2.2   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022                           | KG   | 288,44     | 15,02              | 4.332,37        | 100%       | 288,44 | 4.332,37  | -          | -     | -        |
|                   | 5.2.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022                           | KG   | 387,45     | 13,92              | 5.393,30        | 100%       | 387,45 | 5.393,30  | -          | -     | -        |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVAOADO RACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.114/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 22/04/2026

| PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL |                                                                                                                                                                                   |      |            |                    |                 |            |        |           |            |       |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-------|------------|-------|
| DATA: 22/06/2026                                                                 |                                                                                                                                                                                   |      |            |                    |                 |            |        |           |            |       |       |            |       |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | UNID | QUANTIDADE | CUSTO DO CONTRATO  |                 | 1ª MEDIÇÃO |        |           | 2ª MEDIÇÃO |       |       | 3ª MEDIÇÃO |       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |      |            | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT  | VALOR     | %          | QUANT | VALOR | %          | QUANT |
| 5.2.4                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022                                                       | KG   | 84,90      | 12,56              | 1.066,34        | 100%       | 84,90  | 1.066,34  |            |       |       |            |       |
| 5.2.5                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022                                                       | KG   | 59,80      | 10,62              | 635,08          | 100%       | 59,80  | 635,08    |            |       |       |            |       |
| 5.2.6                                                                            | CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021                                         | M3   | 6,62       | 686,01             | 4.422,23        | 100%       | 6,62   | 4.422,23  |            |       |       |            |       |
| 5.2.7                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022                                                                                       | M3   | 6,62       | 271,94             | 1.800,24        | 100%       | 6,62   | 1.800,24  |            |       |       |            |       |
| 5.3                                                                              | VERGAS E CONTRAVERGAS                                                                                                                                                             |      |            |                    | 4.085,50        | 100,00%    |        | 4.085,50  |            |       |       |            |       |
| 5.3.1                                                                            | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM AF_03/2024                                                                                                                 | M    | 50,00      | 53,24              | 2.662,00        | 100%       | 50,00  | 2.662,00  |            |       |       |            |       |
| 5.3.2                                                                            | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM AF_03/2024                                                                                                           | M    | 25,00      | 56,94              | 1.423,50        | 100%       | 25,00  | 1.423,50  |            |       |       |            |       |
| 5.4                                                                              | LAJE PRÉ-FABRICADA PARA APOIO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                             |      |            |                    | 1.803,29        |            |        |           |            |       |       |            |       |
| 5.4.1                                                                            | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020_PA                     | M2   | 8,75       | 206,09             | 1.803,29        |            |        |           |            |       |       |            |       |
| 6                                                                                | PAREDES E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                              |      |            |                    | 63.207,57       | 100,00%    |        | 63.207,57 |            |       |       |            |       |
| 6.1                                                                              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021                     | M2   | 730,47     | 86,53              | 63.207,57       | 100%       | 730,47 | 63.207,57 |            |       |       |            |       |
| 7                                                                                | COBERTURA                                                                                                                                                                         |      |            |                    | 89.980,67       |            |        |           |            |       |       |            |       |
| 7.1                                                                              | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                          | M2   | 314,88     | 82,33              | 25.924,07       |            |        |           | 100%       |       |       |            |       |
| 7.2                                                                              | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG   | 80,00      | 12,40              | 992,00          |            |        |           | 100%       |       |       |            |       |
| 7.3                                                                              | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR                                                                                           | M2   | 314,88     | 12,84              | 4.043,06        |            |        |           | 100%       |       |       |            |       |
| 7.4                                                                              | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                                  | M2   | 314,88     | 43,41              | 13.668,94       |            |        |           | 100%       |       |       |            |       |

Handwritten signature or mark.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE ÁGUA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0554/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 22/06/2026

| PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PIS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL |                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |   |       |            |         |        |            |   |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|---|-------|------------|---------|--------|------------|---|-------|----------|
| DATA: 22/06/2026                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |      |                   |                    |                 |   |       |            |         |        |            |   |       |          |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                             | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    | 1ª MEDIÇÃO      |   |       | 2ª MEDIÇÃO |         |        | 3ª MEDIÇÃO |   |       |          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | % | QUANT | VALOR      | %       | QUANT  | VALOR      | % | QUANT | VALOR    |
| 7.5                                                                              | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                           | M    | 4,50              | 23,48              | 105,66          |   | -     | -          | 100%    | 23,48  | 105,66     |   | -     | -        |
| 7.6                                                                              | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020_PSA | KG   | 1 585,68          | 15,34              | 24 324,33       |   | -     | -          | 100%    | 15,34  | 24 324,33  |   | -     | -        |
| 7.7                                                                              | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR                                                                                 | M2   | 118,86            | 145,34             | 17 275,11       |   | -     | -          | 100%    | 145,34 | 17 275,11  |   | -     | -        |
| 7.8                                                                              | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                                                                                                                                           | M    | 70,00             | 38,13              | 2 669,10        |   | -     | -          | 100%    | 38,13  | 2 669,10   |   | -     | -        |
| 7.9                                                                              | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO                                                                                                                                                                        | M    | 20,00             | 48,92              | 978,40          |   | -     | -          | 100%    | 48,92  | 978,40     |   | -     | -        |
| 8                                                                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                 |      |                   |                    | 27 526,75       |   | -     | -          | 90,92%  | -      | 25 026,88  |   | -     | 2 500,07 |
| 8.1                                                                              | QUADROS E DISJUNTORES                                                                                                                                                                                 |      |                   |                    | 1 580,30        |   | -     | -          |         | -      | 411,64     |   | -     | 1 168,66 |
| 8.1.1                                                                            | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                                                  | UN   | 1,00              | 174,39             | 174,39          |   | -     | -          | 100%    | 174,39 | 174,39     |   | -     | -        |
| 8.1.2                                                                            | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                           | UN   | 1,00              | 237,25             | 237,25          |   | -     | -          | 100%    | 237,25 | 237,25     |   | -     | -        |
| 8.1.3                                                                            | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                                                          | UN   | 12,00             | 10,47              | 125,64          |   | -     | -          | 100,00% | -      | -          |   | 12,00 | 125,64   |
| 8.1.4                                                                            | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                                                          | UN   | 1,00              | 11,04              | 11,04           |   | -     | -          | 100,00% | -      | -          |   | 1,00  | 11,04    |
| 8.1.5                                                                            | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V                                                                                                                                        | UN   | 2,00              | 82,71              | 165,42          |   | -     | -          | 100,00% | -      | -          |   | 2,00  | 165,42   |
| 8.1.6                                                                            | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                                                             | UN   | 1,00              | 110,50             | 110,50          |   | -     | -          | 100,00% | -      | -          |   | 1,00  | 110,50   |
| 8.1.7                                                                            | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                                                   | UN   | 2,00              | 378,03             | 756,06          |   | -     | -          | 100,00% | -      | -          |   | 2,00  | 756,06   |
| 8.2                                                                              | CABOS E ELETRODUTOS                                                                                                                                                                                   |      |                   |                    | 9 174,48        |   | -     | -          |         | -      | 8 174,48   |   | -     | -        |
| 8.2.1                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                                        | M    | 411,35            | 2,93               | 1 205,26        |   | -     | -          | 100%    | 2,93   | 1 205,26   |   | -     | -        |
| 8.2.2                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                                        | M    | 958,05            | 4,29               | 4 110,03        |   | -     | -          | 100%    | 4,29   | 4 110,03   |   | -     | -        |
| 8.2.3                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                                | M    | 21,40             | 16,39              | 350,75          |   | -     | -          | 100%    | 16,39  | 350,75     |   | -     | -        |
| 8.2.4                                                                            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 35MM², 450/750V / 70°C                                                                                                                                          | M    | 16,00             | 53,35              | 853,60          |   | -     | -          | 100%    | 53,35  | 853,60     |   | -     | -        |

Handwritten signature or mark.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE ÁGUA E DEMAS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-79  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 27/06/2026

PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PI) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL

| CUSTO DO CONTRATO |                                                                                                                                                                               |      |            | 1ª MEDIÇÃO         |                 |   | 2ª MEDIÇÃO |       |      | 3ª MEDIÇÃO |           |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|----------|
| ITEM              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | % | QUANT      | VALOR | %    | QUANT      | VALOR     | %        |
| 8.2.5             | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                             | M    | 323,05     | 7,59               | 2.451,95        |   | -          | -     | 100% | 7,59       | 2.451,95  |          |
| 8.2.6             | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA                           | M    | 8,50       | 23,87              | 202,90          |   | -          | -     | 100% | 23,87      | 202,90    |          |
| 8.3               | SISTEMA DE ATERRAMENTO                                                                                                                                                        |      |            |                    | 2.192,95        |   | -          | -     |      | -          | 2.192,95  |          |
| 8.3.1             | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M                                                                                                                          | UN   | 3,00       | 358,87             | 1.076,61        |   | -          | -     | 100% | 358,87     | 1.076,61  |          |
| 8.3.2             | CABO COBRE NU 16MM2                                                                                                                                                           | M    | 20,00      | 22,86              | 457,20          |   | -          | -     | 100% | 22,86      | 457,20    |          |
| 8.3.3             | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                             | UN   | 3,00       | 52,38              | 157,14          |   | -          | -     | 100% | 52,38      | 157,14    |          |
| 8.3.4             | ELETRODUTO CONDUTITE DE PVC DE 3/4"                                                                                                                                           | M    | 20,00      | 25,10              | 502,00          |   | -          | -     | 100% | 25,10      | 502,00    |          |
| 8.4               | TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS                                                                                                                                           |      |            |                    | 14.579,01       |   | -          | -     |      | -          | 13.247,81 | 1.331,40 |
| 8.4.1             | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT DE EMBUTIR 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO        | PT   | 52,00      | 190,00             | 9.880,00        |   | -          | -     | 100% | 190,00     | 9.880,00  |          |
| 8.4.2             | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"                                                                                 | PT   | 19,00      | 168,40             | 3.199,60        |   | -          | -     | 100% | 168,40     | 3.199,60  |          |
| 8.4.3             | PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"                                                                                      | PT   | 1,00       | 168,01             | 168,01          |   | -          | -     | 100% | 168,01     | 168,01    |          |
| 8.4.4             | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024                                                                        | UN   | 43,00      | 26,36              | 1.133,48        |   | -          | -     |      | -          | -         | 1.133,48 |
| 8.4.5             | ARANDELA EXTERNA PARA PAREDE EM ALUMÍNIO DOIS FOCOS, COR PRETA, MEDIDAS 12 X 9 X 4,5 CM, PARA LÂMPARA EM LED G9 HALOPIN 60W 127V                                              | UN   | 2,00       | 98,96              | 197,92          |   | -          | -     |      | -          | -         | 197,92   |
| 9                 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                       |      |            |                    | 6.319,00        |   | -          | -     |      | -          | -         | 6.319,00 |
| 9.1               | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                         | PT   | 16,00      | 242,38             | 3.878,08        |   | -          | -     |      | -          | -         | 3.878,08 |
| 9.2               | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                            | UN   | 1,00       | 317,94             | 317,94          |   | -          | -     | 100% | 16,00      | 3.878,08  |          |
| 9.3               | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 | UN   | 2,00       | 34,41              | 68,82           |   | -          | -     | 100% | 1,00       | 317,94    |          |
|                   |                                                                                                                                                                               |      |            |                    |                 |   | -          | -     |      | -          | -         | 68,82    |





OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE ÁGUA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 a 22/06/2026

| PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PIS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL |                                                                                                                                                                                                          |      |                   |                    |                 |            |       |       |            |          |          |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|-------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| DATA: 22/06/2026                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |      |                   |                    |                 |            |       |       |            |          |          |            |          |          |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                    |                 | 1ª MEDIÇÃO |       |       | 2ª MEDIÇÃO |          |          | 3ª MEDIÇÃO |          |          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |      | QUANTIDADE DE     | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT | VALOR | %          | QUANT    | VALOR    | %          | QUANT    | VALOR    |
| 9.4                                                                              | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 | UN   | 2,00              | 18,07              | 36,14           | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 2,00       | 36,14    |          |
| 9.5                                                                              | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021                                                                                                                    | UN   | 1,00              | 34,38              | 34,38           | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 1,00       | 34,38    |          |
| 9.6                                                                              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                                                                                          | M    | 96,00             | 4,99               | 479,04          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 96,00      | 479,04   |          |
| 9.7                                                                              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                                                                            | M    | 12,00             | 17,37              | 208,44          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 12,00      | 208,44   |          |
| 9.8                                                                              | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                                                                    | UN   | 16,00             | 8,42               | 134,72          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 16,00      | 134,72   |          |
| 9.9                                                                              | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                                                                              | UN   | 12,00             | 9,01               | 108,12          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 12,00      | 108,12   |          |
| 9.10                                                                             | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016   | UN   | 2,00              | 24,31              | 48,62           | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 2,00       | 48,62    |          |
| 9.11                                                                             | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022                                                                                                 | M    | 36,00             | 15,47              | 556,92          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 36,00      | 556,92   |          |
| 9.12                                                                             | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022                                                                                      | UN   | 18,00             | 6,52               | 117,36          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 18,00      | 117,36   |          |
| 9.13                                                                             | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4")                                                                                                                                                                  | UN   | 6,00              | 55,07              | 330,42          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 6,00       | 330,42   |          |
| 10                                                                               | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                   |      |                   |                    |                 |            |       |       |            |          |          |            |          |          |
| 10.1                                                                             | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                     | PT   | 16,00             | 224,58             | 15.561,63       | -          | -     | -     | -          | -        | 6.966,01 | -          | -        | 8.615,62 |
| 10.2                                                                             | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                                                                    | M    | 70,00             | 33,03              | 3.593,28        | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 16,00      | 3.593,28 |          |
| 10.3                                                                             | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                          | M    | 48,00             | 9,12               | 437,76          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 70,00      | 2.312,10 |          |
| 10.4                                                                             | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                                                         | UN   | 7,00              | 46,30              | 324,10          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 48,00      | 437,76   |          |
| 10.5                                                                             | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)                                                                                                                   | UN   | 2,00              | 71,11              | 142,22          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 7,00       | 324,10   |          |
| 10.6                                                                             | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                            | UN   | 1,00              | 378,36             | 378,36          | -          | -     | -     | -          | -        | 100%     | 2,00       | 142,22   |          |
| 10.7                                                                             | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_12/2020                                             | UN   | 1,00              | 3.618,24           | 3.618,24        | -          | -     | -     | 100%       | 3.618,24 | -        | -          | -        | 3.618,24 |

Handwritten signature



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 135/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 22/06/2026

PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL

| CUSTO DO CONTRATO |                                                                                                                                                                                                  |      |            | 1ª MEDIÇÃO         |                 |      | 2ª MEDIÇÃO |       |      | 3ª MEDIÇÃO |           |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------------|------|------------|-------|------|------------|-----------|---|
| ITEM              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | %    | QUANT      | VALOR | %    | QUANT      | VALOR     | % |
| 10.8              | SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES), AF. 12/2020 PA.                             | UN   | 1,00       | 3.347,77           | 3.347,77        | 100% | -          | -     | 100% | 3.347,77   | 3.347,77  | - |
| 10.9              | *CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)                                                                                                                                                          | UN   | 5,00       | 285,56             | 1.427,80        | -    | -          | -     | 100% | 5,00       | 1.427,80  | - |
| 11                | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                                                      |      |            |                    | 24.295,39       | -    | -          | -     | -    | -          | 24.295,39 | - |
| 11.1              | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                    | UN   | 1,00       | 736,83             | 736,83          | -    | -          | -     | 100% | 1,00       | 736,83    | - |
| 11.2              | BACIA DE LOUÇA BRANCA COXAIXA ACOPLADA                                                                                                                                                           | UN   | 6,00       | 636,40             | 3.818,40        | -    | -          | -     | 100% | 6,00       | 3.818,40  | - |
| 11.3              | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020                                                                             | UN   | 4,00       | 342,82             | 1.371,28        | -    | -          | -     | 100% | 4,00       | 1.371,28  | - |
| 11.4              | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA  | UN   | 2,00       | 1.130,01           | 2.260,02        | -    | -          | -     | 100% | 2,00       | 2.260,02  | - |
| 11.5              | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN   | 2,00       | 1.947,49           | 3.894,98        | -    | -          | -     | 100% | 2,00       | 3.894,98  | - |
| 11.6              | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2,20X0,60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA                       | UN   | 1,00       | 1.747,10           | 1.747,10        | -    | -          | -     | 100% | 1,00       | 1.747,10  | - |
| 11.7              | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO                                | UN   | 1,00       | 606,44             | 606,44          | -    | -          | -     | 100% | 1,00       | 606,44    | - |

17.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 135/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/02/2026 à 22/04/2026

PLANILHA DE LAJENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PIS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                       | UNID | CUSTO DO CONTRATO |                |                 | 1ª MEDIÇÃO |        |           | 2ª MEDIÇÃO |        |           | 3ª MEDIÇÃO |        |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                 |      | QUANTIDADE        | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL R\$ | %          | QUANT  | VALOR     | %          | QUANT  | VALOR     | %          | QUANT  | VALOR     |
| 11.8  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020         | UN   | 1,00              | 494,88         | 494,88          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 1,00   | 494,88    |
| 11.9  | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO                                                                                                                                                 | UN   | 1,00              | 101,25         | 101,25          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 1,00   | 101,25    |
| 11.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FIXAÇÃO AF_01/2020                                                                                                       | UN   | 7,00              | 75,04          | 525,28          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 7,00   | 525,28    |
| 11.11 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                                                     | UN   | 1,00              | 179,62         | 179,62          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 1,00   | 179,62    |
| 11.12 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA-E-2CM                                                                                                                                        | M2   | 2,50              | 530,73         | 1.326,83        |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 2,50   | 1.326,83  |
| 11.13 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-2CM                                                                                                                                                | M2   | 16,00             | 452,03         | 7.232,48        |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 16,00  | 7.232,48  |
| 12    | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                               |      |                   | 2.038,07       |                 |            |        | 1.520,00  |            |        |           |            |        | 519,07    |
| 12.1  | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELÉTRICIDADE DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO      | PT   | 8,00              | 190,00         | 1.520,00        |            | 100%   | 190,00    |            |        | 1.520,00  |            |        |           |
| 12.2  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024                                                                          | UN   | 8,00              | 17,70          | 141,60          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 8,00   | 141,60    |
| 12.3  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMUS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)          | UN   | 1,00              | 16,76          | 16,76           |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 1,00   | 16,76     |
| 12.4  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020, PE                                                                           | UN   | 1,00              | 243,77         | 243,77          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 1,00   | 243,77    |
| 12.5  | PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM                                                                                                                          | UN   | 6,00              | 19,49          | 116,94          |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 6,00   | 116,94    |
| 13    | PISO                                                                                                                                                                            |      |                   | 53.538,98      |                 |            |        | 28.383,98 |            |        |           |            |        | 25.154,64 |
| 13.1  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM                                                                                                                                       | M2   | 366,07            | 43,42          | 15.894,76       |            | -      | -         | 100%       | 366,07 | 15.894,76 |            | -      | -         |
| 13.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE                                     | M2   | 272,56            | 69,79          | 19.021,96       |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 272,56 | 19.021,96 |
| 13.3  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_08/2022                                   | M3   | 4,90              | 785,29         | 3.847,92        |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 4,90   | 3.847,92  |
| 13.4  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM                                                                                                                         | M    | 19,00             | 120,25         | 2.284,75        |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 19,00  | 2.284,75  |
| 13.5  | REVESTIMENTOS DE PISOS CIGRANILITE                                                                                                                                              | M2   | 93,51             | 133,56         | 12.489,20       |            | -      | -         |            | -      | -         | 100%       | 93,51  | 12.489,20 |
| 14    | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                    |      |                   | 93.566,15      |                 |            | 11,88% | 10.927,83 |            | 52,80% | 49.402,18 |            | -      | -         |
| 14.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 | M2   | 1.460,94          | 7,48           | 10.927,83       |            | 100%   | 10.927,83 |            | -      | -         |            | -      | 33.236,14 |

Handwritten signature or mark.



OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RIACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.119/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATADO Nº 125/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/07/2026 à 22/08/2026

PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PLS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL

| CUSTO DO CONTRATO |                                                                                                                                                                                               |      |            | 1ª MEDIÇÃO         |                 |   | 2ª MEDIÇÃO |       |      | 3ª MEDIÇÃO |           |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------------|---|------------|-------|------|------------|-----------|---|
| ITEM              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | % | QUANT      | VALOR | %    | QUANT      | VALOR     | % |
| 14.2              | EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                     | M2   | 266,96     | 32,90              | 8.782,98        |   |            |       | 100% | 32,90      | 8.782,98  |   |
| 14.3              | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                | M2   | 1.193,98   | 34,02              | 40.619,20       |   |            |       | 100% | 34,02      | 40.619,20 |   |
| 14.4              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014         | M2   | 83,58      | 75,48              | 6.308,62        |   |            |       | 100% | 83,58      | 6.308,62  |   |
| 14.5              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV 02 | M2   | 183,38     | 118,27             | 21.688,35       |   |            |       | 100% | 183,38     | 21.688,35 |   |
| 14.6              | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)                                                                                                                                                               | M    | 183,38     | 28,57              | 5.239,17        |   |            |       | 100% | 183,38     | 5.239,17  |   |
| 15                | FORRO                                                                                                                                                                                         |      |            |                    | 17.970,70       |   |            |       |      |            | 17.970,70 |   |
| 15.1              | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023, PS                                                                        | M2   | 263,50     | 68,20              | 17.970,70       |   |            |       | 100% | 263,50     | 17.970,70 |   |
| 16                | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                    |      |            |                    | 59.146,38       |   |            |       |      |            | 59.146,38 |   |
| 16.1              | PORTAS                                                                                                                                                                                        |      |            |                    | 39.083,80       |   |            |       |      |            | 39.083,80 |   |
| 16.1.1            | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA 0,70 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                             | UN   | 3,00       | 1.360,92           | 4.082,76        |   |            |       | 100% | 3,00       | 4.082,76  |   |
| 16.1.2            | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                             | UN   | 8,00       | 1.481,89           | 11.855,12       |   |            |       | 100% | 8,00       | 11.855,12 |   |
| 16.1.3            | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                             | UN   | 1,00       | 1.726,58           | 1.726,58        |   |            |       | 100% | 1,00       | 1.726,58  |   |
| 16.1.4            | PORTA DE AÇO EM CHAPA                                                                                                                                                                         | M2   | 1,89       | 346,13             | 654,19          |   |            |       | 100% | 1,89       | 654,19    |   |
| 16.1.5            | PORTÃO DE CORRER E FIXA, EM GRADIL DE METALON, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                    | M2   | 21,00      | 567,14             | 11.909,94       |   |            |       | 100% | 21,00      | 11.909,94 |   |
| 16.1.6            | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM (3.00X2,10M), INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021                                                                   | M2   | 6,30       | 671,81             | 4.232,40        |   |            |       | 100% | 6,30       | 4.232,40  |   |
| 16.1.7            | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                                                                                                                      | UN   | 2,00       | 324,74             | 649,48          |   |            |       | 100% | 2,00       | 649,48    |   |
| 16.1.8            | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICIA/LARVISTA                                                                                               | M2   | 9,75       | 405,47             | 3.953,33        |   |            |       | 100% | 9,75       | 3.953,33  |   |
| 16.2              | JANELAS                                                                                                                                                                                       |      |            |                    | 14.908,70       |   |            |       |      |            | 14.908,70 |   |
| 16.2.1            | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024                   | M2   | 9,75       | 762,08             | 7.430,28        |   |            |       | 100% | 9,75       | 7.430,28  |   |
| 16.2.2            | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM                                                                                                                                  | M    | 35,00      | 122,93             | 4.302,55        |   |            |       | 100% | 35,00      | 4.302,55  |   |
| 16.2.3            | BASCULANTE EM ALUMÍNIO COR NUPB MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO                                                                                                | M2   | 4,40       | 440,81             | 1.939,56        |   |            |       | 100% | 4,40       | 1.939,56  |   |

Handwritten signature or mark.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE ÁULAS E DEMAS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO RACHO FUNDO  
EMPRESA EXECUTORA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29  
CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 CONTRATO Nº 135/2025 PROCESSO Nº 0556/2025  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/03/2026 à 22/04/2026



PLANILHA DE LAVENTAMENTO DOS SERVIÇOS (PIS) EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL

| DATA: 22/04/2026                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | CUSTO DO CONTRATO |            |                    | 1ª MEDIÇÃO      |   |       | 2ª MEDIÇÃO |            |        | 3ª MEDIÇÃO |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|---|-------|------------|------------|--------|------------|------|------------|
| ITEM                                                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | UNID              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | % | QUANT | VALOR      | %          | QUANT  | VALOR      | %    | VALOR      |
| 16.2.4                                                                                                                           | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO                                                                                                                                                                                                       | M2                | 4,40       | 280,98             | 1.236,31        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          | 100% | 1.236,31   |
| 18.3                                                                                                                             | GRADES                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                    | 5.173,88        |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 5.173,88   |
| 16.3.1                                                                                                                           | GRADE EM METALON                                                                                                                                                                                                                                      | M2                | 17,56      | 294,64             | 5.173,88        |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 5.173,88   |
| 17                                                                                                                               | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |                    | 43.385,47       |   | -     | -          | 10,58%     | -      | -          |      | 4.596,82   |
| 17.1                                                                                                                             | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 28.083,38       |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 3.259,60   |
| 17.1.1                                                                                                                           | FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023                                                                                                                                                                              | M2                | 846,65     | 3,85               | 3.259,60        |   | -     | -          | 100%       | 846,65 | 3.259,60   |      | -          |
| 17.1.2                                                                                                                           | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                                                                                                                            | M2                | 846,65     | 15,90              | 13.461,74       |   | -     | -          | 100%       | 846,65 | 13.461,74  |      | -          |
| 17.1.3                                                                                                                           | PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023                                                                                                                                                                   | M2                | 846,65     | 13,42              | 11.362,04       |   | -     | -          | 100%       | 846,65 | 11.362,04  |      | -          |
| 17.2                                                                                                                             | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 11.520,84       |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 10.183,72  |
| 17.2.1                                                                                                                           | FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023                                                                                                                                                                              | M2                | 347,33     | 3,85               | 1.337,22        |   | -     | -          | 100%       | 347,33 | 1.337,22   |      | -          |
| 17.2.2                                                                                                                           | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                                                                                                                            | M2                | 347,33     | 15,90              | 5.522,55        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 5.522,55   |
| 17.2.3                                                                                                                           | PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023                                                                                                                                                                   | M2                | 347,33     | 13,42              | 4.661,17        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 4.661,17   |
| 17.3                                                                                                                             | PINTURA EM ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |                    | 3.791,15        |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 3.791,15   |
| 17.3.1                                                                                                                           | PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS/EXGETO         | M2                | 51,97      | 26,30              | 1.366,81        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 1.366,81   |
| 17.3.2                                                                                                                           | ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS/EXGETO                                                                                                                                                 | M2                | 52,26      | 46,39              | 2.424,34        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 2.424,34   |
| 18                                                                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |                    | 8.628,12        |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 8.628,12   |
| 18.1                                                                                                                             | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3CM (COLOCADO)                                                                                                                                                                                                    | M2                | 4,04       | 585,75             | 2.366,43        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 2.366,43   |
| 18.2                                                                                                                             | LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM                                                                                                                                                                                                             | UN                | 14,00      | 205,05             | 2.870,70        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 2.870,70   |
| 18.3                                                                                                                             | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2                | 5,52       | 614,31             | 3.390,99        |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 3.390,99   |
| 19                                                                                                                               | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 1.085,59        |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 1.085,59   |
| 19.1                                                                                                                             | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                                         | M2                | 391,25     | 2,10               | 821,63          |   | -     | -          | 100%       | -      | -          |      | 821,63     |
| 19.2                                                                                                                             | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M                                                                                                                                                                                                | UN                | 1,00       | 273,96             | 273,96          |   | -     | -          | R\$ 100,00 | -      | -          |      | 273,96     |
| VALOR ORÇAMENTO:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 887.766,99      |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 239.416,36 |
| VALOR BDI TOTAL:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 197.733,01      |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 68.832,20  |
| VALOR TOTAL:                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 885.500,00      |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 308.248,55 |
| SALDO DA OBRA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 0,00            |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 34,81%     |
| VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (FINAL): R\$ 308.248,55 (trezentos e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    |                 |   | -     | -          |            | -      | -          |      |            |
| TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 287.587,81      |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 278.853,54 |
| TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    | 33,61%          |   | -     | -          |            | -      | -          |      | 31,58%     |
| TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |                    |                 |   | -     | -          |            | -      | -          |      |            |







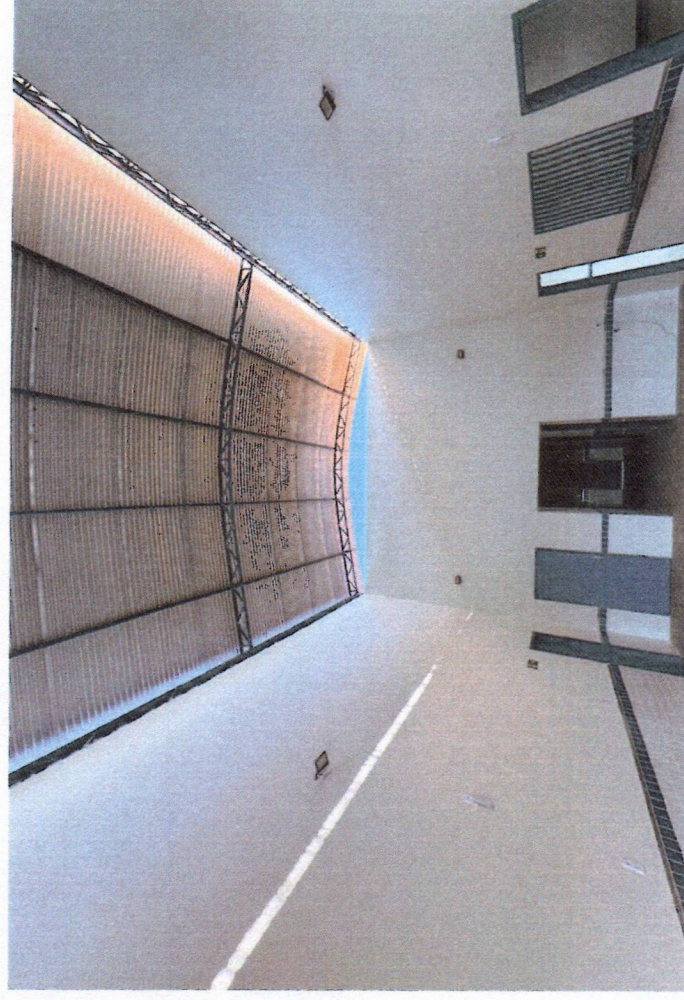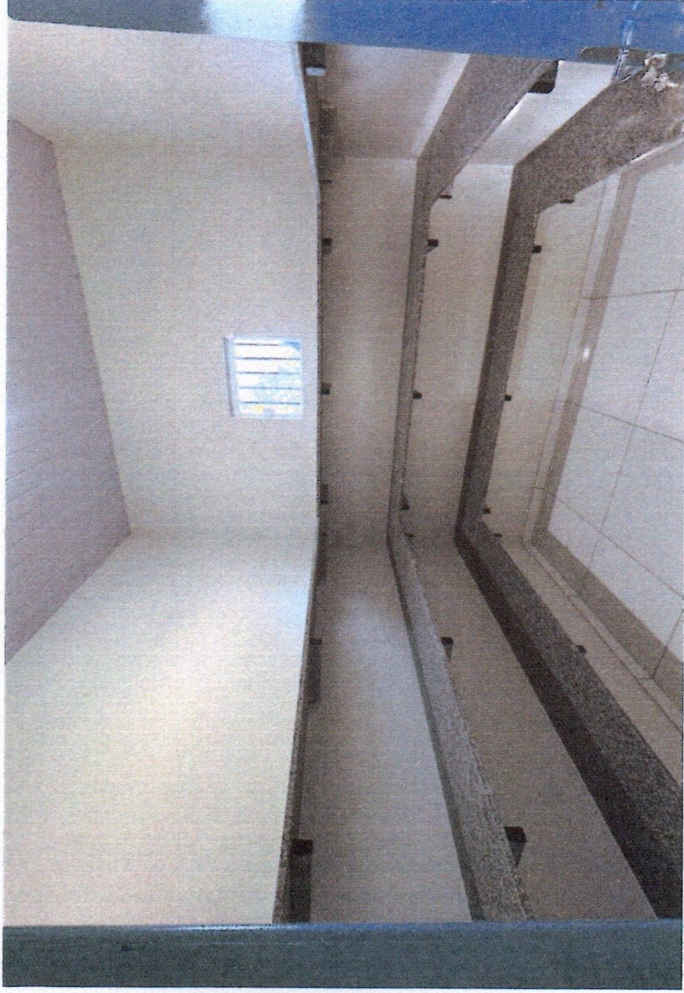












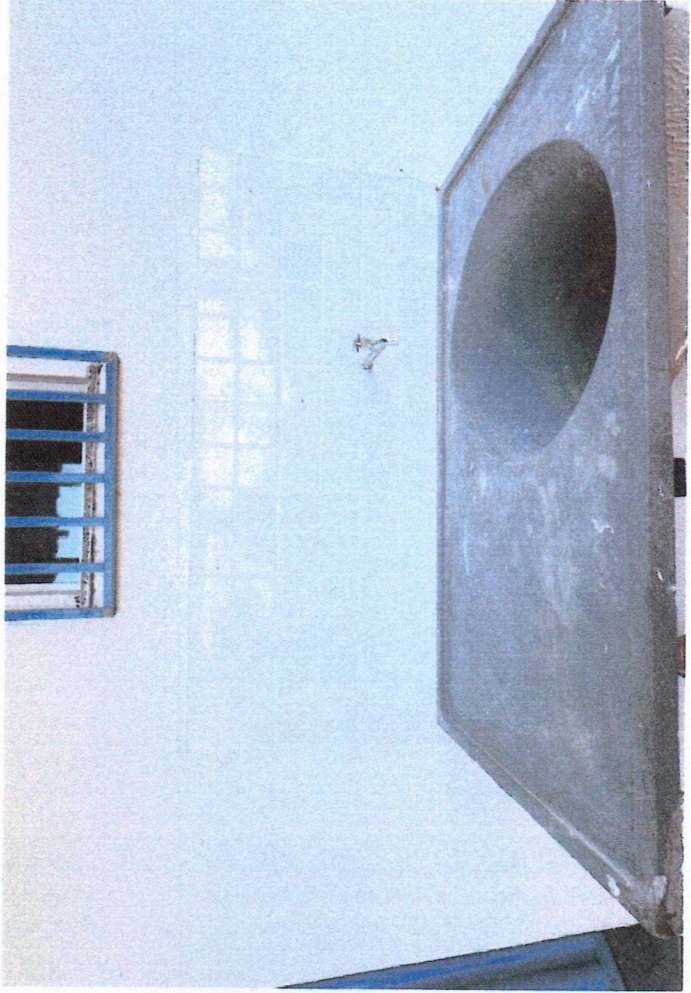





**OFICIO Nº 06/2026**

Ilmo. Senhor

**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinha-MA

A empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES ES SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 40.899.116/0001-29**.

DEM ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR GENTILMENTE O PAGAMENTO DA NF Nº 02, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME O PROJETO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA U. E DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVO RIACHO FUNDO EM CHAPADINHA/MA, MEDIANTE O CONTRATO ADM Nº 125/2025, PROC. ADM Nº 0556/2025, O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS REFERENTE DA MEDIÇÃO É DE 308.248,55, O VALOR PODE SER DEPOSITADO NA SEGUINTE CONTA:

**CODIGO DO BANCO: 403 - CORA SCD**

**AGÊNCIA: 0001 / CONTACORRENTE: 4569523-9**

**RAZÃO SOCIAL: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES**

**CNPJ: 40.899.116/0001-29**

**SÃO LUÍS - MA, EM 06 DE JULHO DE 2026.**

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES ES SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 40.899.116/0001-29**

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 40.899.116/0001-29**

---





## Chave de Acesso da NFS-e

21113002240899116000129000000000000226077379667108

## Número da NFS-e

2

## Competência da NFS-e

06/07/2026

## Data e Hora da emissão da NFS-e

06/07/2026 21:11:27

## Número da DPS

7

## Série da DPS

70000

## Data e Hora da emissão da DPS

06/07/2026 21:11:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

40.899.116/0001-29

## Inscrição Municipal

98280556

## Telefone

(98) 8900-2013

## Nome / Nome Empresarial

NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

## E-mail

SYLVESTERCN07@GMAIL.COM

## Endereço

SENADOR VITORINO FREIRE, 1, EDIF JONAS MARTINS SOARESSALA  
401 4 PAV, AREINHA

## Município

São Luís - MA

## CEP

65030-015

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

30.887.156/0001-05

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA

## E-mail

-

## Endereço

SENADOR VITORINO FREIRE, 1042, CENTRO

## Município

Chapadinha - MA

## CEP

65500-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Chapadinha - MA

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA U. E DE 04 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVO RIACHO FUNDO EM CHAPADINHA/MA.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Chapadinha - MA

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 308.248,55

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

R\$ 123.299,42

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

R\$ 184.949,13

## Alíquota Aplicada

2,00%

## Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

## ISSQN Apurado

R\$ 3.698,98

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## Contribuição Previdenciária - Retida

-

## Contribuições Sociais - Retidas

-

## Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

## PIS - Débito Apuração Própria

-

## COFINS - Débito Apuração Própria

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 308.248,55

## Desconto Condicionado

-

## Desconto Incondicionado

-

## ISSQN Retido

R\$ 3.698,98

## Total das Retenções Federais

-

## PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 304.549,57


## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: NF REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME O PROJETO, MEDIANTE O CONTRATO ADM Nº 125/2025, PROC. ADM Nº 0556/2025. | Cod  
Obra: MA20250936299 | NBS: 101012200 | Doc Tec: MA20250936299



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.899.116/0001-29  
**Razão Social:** NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV SENADOR VITORINO FREIRE 1 EDIF JONAS MARTINS/ AREINHA / SAO LUIS / MA / 65030-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/07/2026 a 01/08/2026

**Certificação Número:** 2026070305055898964400

Informação obtida em 06/07/2026 15:44:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.899.116/0001-29

Certidão nº: 43216113/2026

Expedição: 22/04/2026, às 09:28:40

Validade: 19/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.899.116/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.899.116/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:47:37 do dia 06/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2027.

Código de controle da certidão: **48E6.8A77.C5D5.4FCD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 171905/26

**Data da**

06/07/2026 15:48:45

**Inscrição Estadual:** 126853460

**CPF/CNPJ:** 40899116000129

**Razão Social:** NASCIMENTO CONSTRUAES E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** AVE SENADOR VITORINO FREIRE, 1 EDIF JONAS MARTINS SOARESSALA 401 - 4

**Telefone:** (98)991207413

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 067109/26

**Data da**

06/07/2026 15:50:31

**Inscrição Estadual:** 126853460

**CPF/CNPJ:** 40899116000129

**Razão Social:** NASCIMENTO CONSTRUAES E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** AVE SENADOR VITORINO FREIRE, 1 EDIF JONAS MARTINS SOARESSALA 401 - 4

**Telefone:** (98)991207413

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





CERTIFICADO  
1020260092156846



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**Número da Certidão: 00013542652026**

Validade: 19/08/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.  
#baixaempr

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA                             |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CNPJ: 40.899.116/0001-29                             | Inscrição Municipal: 98280556                           |
| Razão Social: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                                                         |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL                        |                                                         |
| 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                  |                                                         |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO                              |                                                         |
| Logradouro: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE          |                                                         |
| Número: 1                                            | Complemento: EDIF JONAS MARTINS SOARESSALA 401 - 4 PAV. |
| Bairro: AREINHA                                      |                                                         |
| Município: SÃO LUÍS - MA                             | CEP: 65030015                                           |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **21 de abril de 2026 às 12:19**, sob o código de autenticidade nº **2A4ABA7664A747230B29F954ACB3B86B**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2025 –  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº1582/2026,  
APENSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
0556/2025.**

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Rua Antonio Rodrigues da Mata, s/n- Campo Velho, Chapadinha – MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede Rua Pernambuco, nº 68 – Lote Brasil, Loja 03, Bairro Chácara, CEP: 65.066-851/São Luis-MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.899.116/0001-29, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. Sylvester da Conceição Nascimento, brasileiro, solteiro, empresário, residente na Rua Tupinambá, 5, Bloco 5, Apartamento 4, Residencial Murici II, Bairro Turu – São Luis/MA, CEP: 65.066-420, portador da carteira de identidade nº 07081256672 DETRAN/MA e CPF/MF nº 607.427.033-39, doravante designada **CONTRATADA**. As partes acima identificadas resolvem, de comum acordo e com fundamento no artigo 107, inciso I da Lei nº 14.133/2021, celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 125/2025, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 125/2025, visando a Contratação de empresa especializada para serviços de construção de uma U.E. de 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Riacho Fundo município de Chapadinha-MA

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo inicialmente pactuado, passando a vigorar de 08 de Abril de 2026 à 08 de Abril de 2027.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** A presente prorrogação encontra fundamento no artigo 107, inciso I da Lei nº 14.133/2021, que permite a alteração contratual nas condições aqui especificadas.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02.35.00              | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                               |
| 12.361.0016.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL           |
| 12.365.0015.1016.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL              |
| 02.36.00              | FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA                                    |
| 12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30% |
| 12.365.0015.1009.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%    |
| 44.90.51.00           | Obras e Instalações.....                                                   |



### CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 125/2025 que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
2. Este Termo Aditivo passa a integrar o Contrato original para todos os efeitos legais e contratuais.

### CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado na forma da legislação vigente, passando a produzir seus efeitos a partir de sua assinatura pelas partes.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Chapadina(MA), 02 de Abril de 2026.

**NARA DA SILVA MACEDO**  
Responsável legal da CONTRATANTE



**SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**  
Responsável legal da CONTRATADA
