

OFICIO Nº 291/2026 – GAB. SINURB

Chapadina MA, 08 de julho de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 7ª medição dos serviços de construção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadina, executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretária,


Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **7ª Medição** de serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob nº CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de construção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadina**, Conforme:

Contrato nº 225/2025,
Processo Adm. nº 3093/2025,
Concorrência nº 024/2025,
NF nº 090,
Valor R\$ 124.832,56

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG. 4323-0
C/C. 50835-7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 7ª MEDIÇÃO CONTRATO 225/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO


A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar a **7 medição do contrato para construção da secretaria de infraestrutura e urbanismo de Chapadinha**.

São Luís, MA – 03 de JULHO de 2026

THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:8452146
5315

Assinado de forma digital por THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.07.06 12:27:19 -03'00'

THOMMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

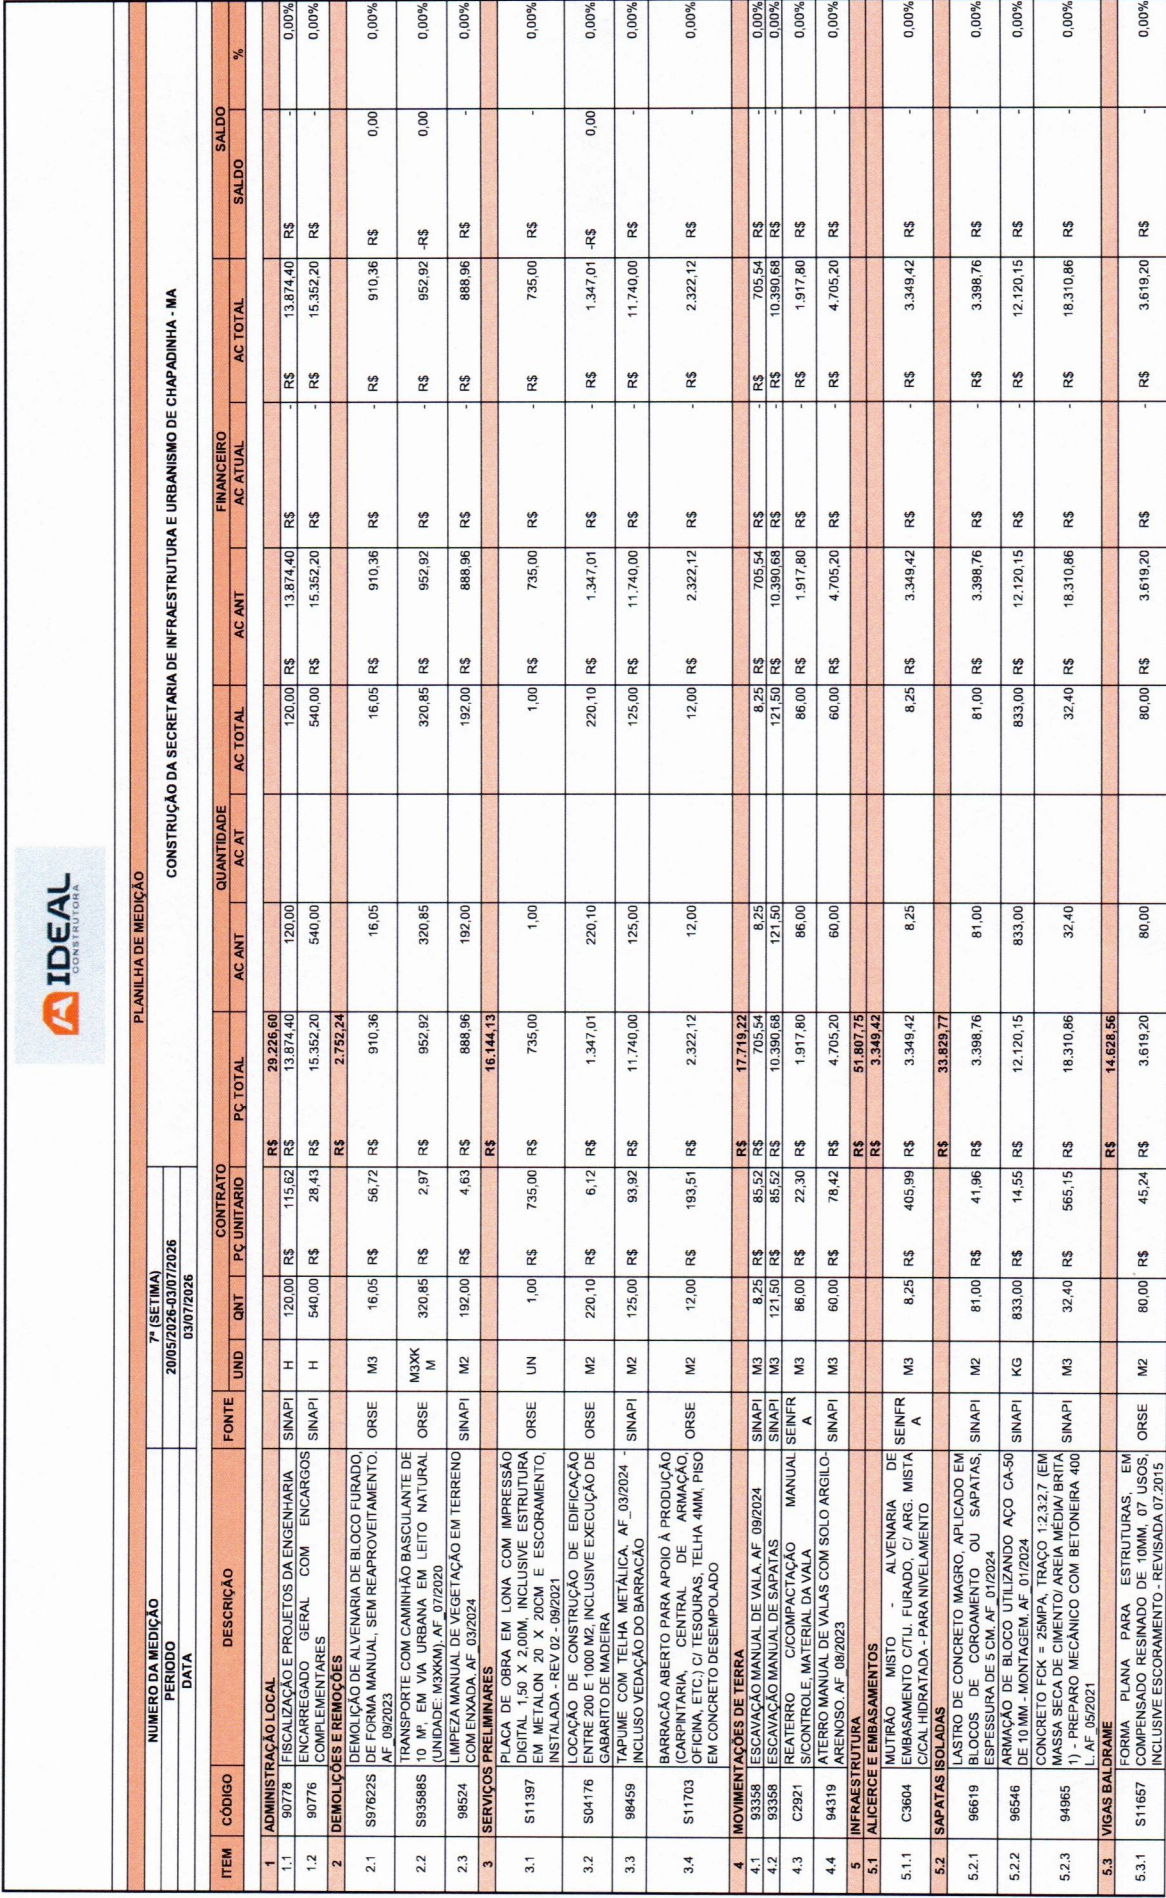

5.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	146,30	R\$	14,52	R\$	2.124,28	146,30	R\$	2.124,28	R\$	-	R\$	2.124,28	R\$	0,00	0,00%
5.3.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	231,00	R\$	13,04	R\$	3.012,24	231,00	R\$	3.012,24	R\$	-	R\$	3.012,24	R\$	-	0,00%
5.3.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,60	R\$	565,15	R\$	3.164,84	5,60	R\$	3.164,84	R\$	-	R\$	3.164,84	R\$	-	0,00%
5.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZADORA	ORSE	M2	100,00	R\$	27,08	R\$	2.708,00	100,00	R\$	2.708,00	R\$	-	R\$	2.708,00	R\$	-	0,00%
6	SUPRAESTRUTURA																		
6.1	PILARES																		
6.1.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	216,00	R\$	46,25	R\$	9.990,00	216,00	R\$	9.990,00	R\$	-	R\$	9.990,00	R\$	-	0,00%
6.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	336,00	R\$	14,52	R\$	4.878,72	336,00	R\$	4.878,72	R\$	-	R\$	4.878,72	R\$	-	0,00%
6.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.120,00	R\$	11,69	R\$	13.092,80	1.120,00	R\$	13.092,80	R\$	-	R\$	13.092,80	R\$	-	0,00%
6.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	17,80	R\$	565,15	R\$	10.059,67	17,80	R\$	10.059,67	R\$	-	R\$	10.059,67	R\$	-	0,00%
6.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	17,80	R\$	292,60	R\$	5.208,28	17,80	R\$	5.208,28	R\$	-	R\$	5.208,28	R\$	-	0,00%
6.2	VIGAS																		
6.2.1	VIGAS N350																		
6.2.1.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	144,00	R\$	46,25	R\$	6.660,00	144,00	R\$	6.660,00	R\$	-	R\$	6.660,00	R\$	-	0,00%
6.2.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	221,50	R\$	14,52	R\$	3.216,18	221,50	R\$	3.216,18	R\$	-	R\$	3.216,18	R\$	-	0,00%
6.2.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	444,00	R\$	11,69	R\$	5.190,36	444,00	R\$	5.190,36	R\$	-	R\$	5.190,36	R\$	-	0,00%
6.2.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,80	R\$	565,15	R\$	6.103,62	10,80	R\$	6.103,62	R\$	-	R\$	6.103,62	R\$	-	0,00%
6.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	10,80	R\$	292,60	R\$	3.160,08	10,80	R\$	3.160,08	R\$	-	R\$	3.160,08	R\$	-	0,00%
6.2.2	VIGAS N700																		
6.2.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	67,05	R\$	46,25	R\$	3.101,06	67,05	R\$	3.101,06	R\$	-	R\$	3.101,06	-R\$	0,00	0,00%
6.2.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	220,00	R\$	13,04	R\$	2.868,80	220,00	R\$	2.868,80	R\$	-	R\$	2.868,80	R\$	-	0,00%
6.2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	120,00	R\$	14,52	R\$	1.742,40	120,00	R\$	1.742,40	R\$	-	R\$	1.742,40	R\$	-	0,00%

6.2.2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA) (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	4,10	R\$	585,15	R\$	2.317,12	4,10		4,10	R\$	2.317,12	R\$	2.317,12	R\$	0,01	0,00%
6.2.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	4,10	R\$	292,60	R\$	1.199,66	4,10			4,10	R\$	1.199,66	R\$	1.199,66	-	0,00%
6.2.3	VIGAS CAIXA D'ÁGUA																		
6.2.3.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	15,00	R\$	46,25	R\$	693,75	15,00			15,00	R\$	693,75	R\$	693,75	-	0,00%
6.2.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	23,10	R\$	14,52	R\$	335,41	23,10			23,10	R\$	335,41	R\$	335,41	0,00	0,00%
6.2.3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA) (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,15	R\$	585,15	R\$	649,92	1,15			1,15	R\$	649,92	R\$	649,92	0,00	0,00%
6.2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,15	R\$	292,60	R\$	336,49	1,15			1,15	R\$	336,49	R\$	336,49	-	0,00%
6.2.3.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	46,30	R\$	11,69	R\$	541,25	46,30			46,30	R\$	541,25	R\$	541,25	0,00	0,00%
6.2.4	VIGAS PLATIBANDAS																		
6.2.4.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	31,60	R\$	46,25	R\$	1.461,50	31,60			31,60	R\$	1.461,50	R\$	1.461,50	-	0,00%
6.2.4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	100,00	R\$	13,04	R\$	1.304,00	100,00			100,00	R\$	1.304,00	R\$	1.304,00	-	0,00%
6.2.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	52,00	R\$	14,52	R\$	755,04	52,00			52,00	R\$	755,04	R\$	755,04	-	0,00%
6.2.4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA) (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,90	R\$	585,15	R\$	1.073,79	1,90			1,90	R\$	1.073,79	R\$	1.073,79	0,01	0,00%
6.2.4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,90	R\$	292,60	R\$	555,94	1,90			1,90	R\$	555,94	R\$	555,94	-	0,00%
6.3	LAJES																		
6.3.1	S101963S	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF. 11/2020	ORSE	M2	196,00	R\$	172,38	R\$	33.786,48	190,00			190,00	R\$	32.752,20	R\$	32.752,20	1.034,28	3,06%
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS																		
6.4.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024 - PORTAS	SINAPI	M	77,00	R\$	53,78	R\$	4.141,06	77,00			77,00	R\$	4.141,06	R\$	4.141,06	-	0,00%
6.4.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024 - JANELAS	SINAPI	M	43,40	R\$	41,84	R\$	1.815,86	43,40			43,40	R\$	1.815,86	R\$	1.815,86	0,00	0,00%
7	ALVENARIAS E PAINES																		
7.1	S103322S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	ORSE	M2	982,00	R\$	108,06	R\$	106.114,92	982,00			982,00	R\$	106.114,92	R\$	106.114,92	-	0,00%
8	COBERTURA																		
8.1	101978	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	SINAPI	M	37,00	R\$	38,98	R\$	1.442,26	37,00			37,00	R\$	1.442,26	R\$	1.442,26	-	0,00%
8.2	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO	ORSE	M	64,00	R\$	49,59	R\$	3.173,76	64,00			64,00	R\$	3.173,76	R\$	3.173,76	-	0,00%
8.3	S89714S	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS	ORSE	M	36,00	R\$	34,20	R\$	1.231,20	36,00			36,00	R\$	1.231,20	R\$	1.231,20	-	0,00%

10.3.1	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$	3.571,21	R\$	3.571,21	R\$	-	R\$	3.571,21	R\$	-	0,00%
10.3.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	SEINFRA	M	30,00	R\$	12,66	R\$	379,80	R\$	30,00	R\$	379,88	R\$	-	-0,02%
10.3.3	S94704S	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	ORSE	UN	1,00	R\$	23,75	R\$	23,75	R\$	1,00	R\$	23,75	R\$	-	0,00%
10.3.4	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$	73,17	R\$	73,17	R\$	1,00	R\$	73,17	R\$	-	0,00%
10.3.5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$	73,65	R\$	73,65	R\$	1,00	R\$	73,65	R\$	-	0,00%
10.3.6	S94706S	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	ORSE	UN	1,00	R\$	31,67	R\$	31,67	R\$	1,00	R\$	31,67	R\$	-	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA															
11.1	ELETRODUTOS DA REDE															
11.1.1	S91834S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	ORSE	M	300,00	R\$	16,26	R\$	4.878,00	R\$	-	R\$	4.878,00	R\$	-	0,00%
11.1.2	S91836S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	ORSE	M	100,00	R\$	19,15	R\$	1.915,00	R\$	-	R\$	383,00	R\$	1.532,00	80,00%
11.1.3	S91840S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	ORSE	M	100,00	R\$	19,69	R\$	1.969,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.969,00	100,00%
11.1.4	S93008S	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	ORSE	M	54,00	R\$	18,43	R\$	995,22	R\$	5,00	R\$	276,45	R\$	368,60	62,96%
11.2	CABOS															
11.2.1	S91925S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	ORSE	M	310,00	R\$	3,65	R\$	1.131,50	R\$	-	R\$	1.131,50	R\$	-	0,00%
11.2.2	S91926S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	ORSE	M	890,00	R\$	4,37	R\$	3.889,30	R\$	-	R\$	3.889,30	R\$	-	0,00%
11.2.3	S91928S	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	ORSE	M	580,00	R\$	6,78	R\$	3.932,40	R\$	-	R\$	3.932,40	R\$	-	0,00%
11.2.4	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	SINAPI	M	54,00	R\$	28,94	R\$	1.562,76	R\$	-	R\$	1.562,76	R\$	-	0,00%
11.3	PONTOS DE TOMADAS E LÓGICA															
11.3.1	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - INTERNET E LÓGICA	SINAPI	UN	4,00	R\$	5,87	R\$	23,48	R\$	5,00	R\$	29,35	R\$	5,87	-25,00%
11.3.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+1T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	SINAPI	UN	74,00	R\$	146,51	R\$	10.841,74	R\$	89,00	R\$	13.039,39	R\$	2.197,65	-20,27%

11.3.3	104480	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$	142,14	R\$	1.989,96	17,00			17,00	R\$	2.416,38	R\$	-	R\$	2.416,38	-R\$	426,42	-21,43%
11.3.4	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022 (COMBATE A INCÊNDIO)	SINAPI	UN	7,00	R\$	146,51	R\$	1.025,57	9,00			9,00	R\$	1.318,59	R\$	-	R\$	1.318,59	-R\$	293,02	-28,57%
11.4	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS																					
11.4.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$	170,17	R\$	7.487,48	34,00			34,00	R\$	5.785,78	R\$	-	R\$	5.785,78	R\$	1.701,70	22,73%
11.4.2	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W", 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	38,00	R\$	60,05	R\$	2.281,90	38,00			38,00	R\$	2.281,90	R\$	-	R\$	2.281,90	R\$	-	0,00%
11.4.3	S97598S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	ORSE	UN	7,00	R\$	16,33	R\$	114,31	7,00			7,00	R\$	114,31	R\$	-	R\$	114,31	R\$	-	0,00%
11.4.4	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$	81,22	R\$	162,44	2,00			2,00	R\$	162,44	R\$	-	R\$	162,44	R\$	-	0,00%
11.4.5	111130	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	ORSE	UN	4,00	R\$	53,75	R\$	215,00	4,00			4,00	R\$	215,00	R\$	-	R\$	215,00	R\$	-	0,00%
11.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES																					
11.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$	20,40	R\$	81,60	4,00			4,00	R\$	81,58	R\$	-	R\$	81,58	R\$	0,02	0,02%
11.5.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$	20,40	R\$	122,40	6,00			6,00	R\$	122,37	R\$	-	R\$	122,37	R\$	0,03	0,02%
11.5.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	14,00	R\$	20,40	R\$	285,60	14,00			14,00	R\$	285,53	R\$	-	R\$	285,53	R\$	0,07	0,02%
11.5.4	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$	98,96	R\$	197,92	2,00			2,00	R\$	197,91	R\$	-	R\$	197,91	R\$	0,01	0,01%
11.5.5	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R\$	85,23	R\$	170,46	2,00			2,00	R\$	170,46	R\$	-	R\$	170,46	R\$	-	0,00%
11.5.6	S12226	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV 01 03/2022	ORSE	UN	2,00	R\$	647,85	R\$	1.295,70	2,00			2,00	R\$	1.295,70	R\$	-	R\$	1.295,70	R\$	-	0,00%
11.5.7	00001062	CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$	230,30	R\$	230,30	1,00			1,00	R\$	230,30	R\$	-	R\$	230,30	R\$	-	0,00%
11.6	ATERRAMENTO E SPDA																					
11.6.1	S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	ORSE	UN	3,00	R\$	122,02	R\$	366,06	3,00			3,00	R\$	366,06	R\$	-	R\$	366,06	R\$	-	0,00%
11.6.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$	54,86	R\$	164,58	3,00			3,00	R\$	164,58	R\$	-	R\$	164,58	R\$	-	0,00%
11.6.3	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	SINAPI	M	12,00	R\$	28,94	R\$	347,28	12,00			12,00	R\$	347,28	R\$	-	R\$	347,28	R\$	-	0,00%
12	REVESTIMENTOS																					
12.1	EM ARGAMASSA																					
12.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	4,59	R\$	8.262,00	1.620,00			1.620,00	R\$	7.435,80	R\$	-	R\$	7.435,80	R\$	826,20	10,00%

12.1.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	37,89	R\$	68.202,00	1.800,00		1800,00	R\$	68.202,00	R\$	-	0,00%
12.2	CERÂMICOS							R\$	6.582,40								
12.2.1	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE - ÁREA LAVÁVEIS	SINAPI	M2	80,00	R\$	82,28	R\$	6.582,40	80,00		80,00	R\$	6.582,40	R\$	-	0,00%
13	PISOS							R\$	73.627,94								
13.1	EM GRANILITE							R\$	22.312,79								
13.1.1	S104162S	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	ORSE	M2	153,10	R\$	91,40	R\$	13.993,34	76,55	62,45	139,00	R\$	6.996,67	R\$	5.707,93	9,21%
13.1.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	SINAPI	M2	153,10	R\$	54,34	R\$	8.319,45	153,10		153,10	R\$	8.319,45	R\$	0,00	0,00%
13.2	CERÂMICOS							R\$	5.231,60								
13.2.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	SINAPI	M2	40,00	R\$	54,34	R\$	2.173,60	40,00		40,00	R\$	2.173,60	R\$	-	0,00%
13.2.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	40,00	R\$	76,45	R\$	3.058,00	40,00		40,00	R\$	3.058,00	R\$	-	0,00%
13.3	PORCELANATOS							R\$	34.741,80								
13.3.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	SINAPI	M2	180,00	R\$	54,34	R\$	9.781,20	153,00	12,50	165,50	R\$	8.314,02	R\$	679,25	8,06%
13.3.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	180,00	R\$	138,67	R\$	24.960,60	0,00	165,50	165,50	R\$	-	R\$	22.949,89	8,06%
13.4	RODAPÉS							R\$	3.757,60								
13.4.1	S88550S	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	ORSE	M	335,50	R\$	11,20	R\$	3.757,60	0,00		167,75	R\$	-	R\$	1.878,80	50,00%
13.5	EXTERNOS							R\$	7.584,15								
13.5.1	S94993S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	ORSE	M2	105,00	R\$	72,23	R\$	7.584,15	0,00	39,00	39,00	R\$	-	R\$	2.816,97	62,86%
14	FORROS							R\$	16.891,00								
14.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023, PS	SINAPI	M2	350,00	R\$	48,26	R\$	16.891,00	317,00		317,00	R\$	15.298,42	R\$	1.592,58	9,43%
15	PINTURA							R\$	54.943,70								
15.1	PINTURA INTERNA							R\$	38.130,45								
15.1.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	ORSE	M2	1.165,00	R\$	3,61	R\$	4.205,65	1.165,00		1165,00	R\$	4.205,65	R\$	-	0,00%
15.1.2	S88497S	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃO'S, LUXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	15,92	R\$	18.546,80	815,50	349,50	1165,00	R\$	12.982,76	R\$	5.564,04	0,00%

15.1.3	S88489S	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	13,20	R\$	15.378,00	0,00	1.165,00	1165,00	R\$	-	R\$	15.378,00	R\$	-	0,00%
15.2	PINTURA EXTERNA					R\$		R\$	12.193,25										
15.2.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 03/2024	ORSE	M2	475,00	R\$	3,61	R\$	1.714,75	237,50	237,50	475,00	R\$	857,38	R\$	1.714,75	R\$	-	0,00%
15.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_03/2024	SINAPI	M2	475,00	R\$	22,06	R\$	10.478,50	237,50	237,50	475,00	R\$	5.239,25	R\$	10.478,50	R\$	-	0,00%
15.3	FORROS					R\$		R\$	4.620,00										
15.3.1	S88489S	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	ORSE	M2	350,00	R\$	13,20	R\$	4.620,00	317,00	317,00	317,00	R\$	4.184,40	R\$	4.184,40	R\$	435,60	9,43%
16	ESQUADRIAS					R\$		R\$	78.408,87										
16.1	PORTAS					R\$		R\$	38.223,38										
16.1.1	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$	1.467,87	R\$	22.018,05	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	22.018,05	100,00%
16.1.2	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA ((LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$	1.112,28	R\$	6.673,68	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.673,68	100,00%
16.1.3	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA ((LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$	1.143,71	R\$	1.143,71	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.143,71	100,00%
16.1.4	S13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01-10/2021	ORSE	M2	12,00	R\$	681,47	R\$	8.177,64	0,00	12,00	12,00	R\$	-	R\$	8.177,64	R\$	-	0,00%
16.1.5	S13937	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, REDONDO, ACABAMENTO EM AÇO ECOVADO, FOSCO.	ORSE	UN	2,00	R\$	105,15	R\$	210,30	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	210,30	100,00%
16.2	JANELAS		SEINFRA			R\$		R\$	8.708,77										
16.2.1	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	A	M	31,00	R\$	89,02	R\$	2.759,62	31,00	0,00	31,00	R\$	2.759,63	R\$	-	R\$	0,01	0,00%
16.2.2	S94570S	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO	ORSE	M2	17,00	R\$	349,95	R\$	5.949,15	0,00	17,00	17,00	R\$	-	R\$	5.949,15	R\$	-	0,00%
16.3	GRADES					R\$		R\$	5.159,67										
16.3.1	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	17,00	R\$	303,51	R\$	5.159,67	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.159,67	100,00%
16.4	VIDRAÇAS					R\$		R\$	26.317,05										
16.4.1	I14843	FACHADA EM PELE DE VIDRO, MODELO COM PERFIL ANODIZADO PRETO, VIDRO TIPO REFLETA PRATA 444 MM, INSTALADO, CONFORME PROJETO, OBRA - REFORMA TCE-SE	ORSE	M2	9,15	R\$	1.456,00	R\$	13.322,40	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13.322,40	100,00%
16.4.2	S13882	BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	ORSE	M2	30,15	R\$	431,00	R\$	12.994,65	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	12.994,65	100,00%
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					R\$		R\$	556,22										
17.1	PLACAS E EXTINTORES					R\$		R\$	556,22										
17.1.1	S01511	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	UN	2,00	R\$	221,70	R\$	443,40	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	443,40	100,00%

17.1.2	S11852	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	6,00	R\$	13,90	R\$	83,40	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	83,40	100,00%
17.1.3	S12137	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	2,00	R\$	14,71	R\$	29,42	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	29,42	100,00%
18	GRANITOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																			
18.1	GRANITOS E LOUÇAS																			
18.1.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	3,55	R\$	386,64	R\$	1.372,57	3,55			R\$	1.372,57	R\$	-	R\$	1.372,57	0,00%	
18.1.2	S02087	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR), INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	UN	5,00	R\$	164,12	R\$	820,60	5,00			R\$	820,60	R\$	-	R\$	820,60	0,00%	
18.1.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$	641,28	R\$	3.206,40	0,00			R\$	-	R\$	3.206,40	R\$	3.206,40	0,00%	
18.1.4	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	313,51	R\$	313,51	0,00			R\$	-	R\$	313,51	R\$	313,51	0,00%	
18.2	METAIS E ACESSÓRIOS																			
18.2.1	S95544S	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	ORSE	UN	5,00	R\$	38,25	R\$	191,25	0,00			R\$	-	R\$	191,25	R\$	191,25	0,00%	
18.2.2	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	5,00	R\$	62,13	R\$	310,65	0,00			R\$	-	R\$	310,63	R\$	310,63	0,01%	
18.2.3	S03685	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1159 C39 OU SIMILAR	ORSE	UN	7,00	R\$	89,22	R\$	624,54	0,00			R\$	-	R\$	624,54	R\$	624,54	0,00%	
18.2.4	I02910	VALVULA EM PVC PARA PIA DE COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, ASTRA VP2 OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$	18,86	R\$	18,86	0,00			R\$	-	R\$	18,86	R\$	18,86	0,00%	
18.2.5	S86900S	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	ORSE	UN	1,00	R\$	196,97	R\$	196,97	0,00			R\$	-	R\$	196,97	R\$	196,97	0,00%	
18.2.6	S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	ORSE	UN	4,00	R\$	67,76	R\$	271,04	0,00			R\$	-	R\$	271,04	R\$	271,04	0,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
19.1	ACESSÓRIOS FINAIS																			
19.1.1	I04976	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM	ORSE	UN	40,00	R\$	95,76	R\$	3.830,40	0,00			R\$	-	R\$	-	R\$	3.830,40	100,00%	
19.1.2	S13948	REVESTIMENTO EM ACM ESTRUTURADO FOSCO, CORES CONFORME O PROJETO.	ORSE	M2	35,70	R\$	979,00	R\$	34.950,30	17,85			R\$	17.475,15	R\$	17.475,15	R\$	34.950,30	0,00%	
19.2	JARDINAGENS																			
19.2.1	S12135	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	M2	3,00	R\$	26,81	R\$	80,43	0,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-	80,43	100,00%
19.2.2	S08820	PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	10,00	R\$	14,88	R\$	148,80	0,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-	148,80	100,00%
19.3	LIMPEZAS																			
19.3.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M2	380,00	R\$	2,32	R\$	881,60	0,00			R\$	-	R\$	-	R\$	-	881,60	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:							R\$	856.303,11					R\$	670.085,07	R\$	97.908,83	R\$	767.983,86	R\$	88.319,25
VALOR BDI TOTAL:							R\$	235.471,67					R\$	184.264,25	R\$	26.933,62	R\$	211.185,08	R\$	24.866,59
VALOR TOTAL:							R\$	1.091.774,78					R\$	854.349,32	R\$	124.832,55	R\$	979.188,94	R\$	112.005,84

Chapadinha MA, 03 de JULHO de 2026

VINICIUS ALMEIDA VERAS
ENG CIVIL
CREA 11150263-5

VINICIUS ALMEIDA VERAS
Assinado de forma digital
VINICIUS ALMEIDA VERAS
313
160821 0326

CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE CHAPADINHA, MA.
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS CNPJ: 00.519.233/0001-98
MEDICÃO: 7ª MEDICÃO
VALOR: R\$ 124.832,56

PERÍODO: 25/05/2026 A 03/07/2026
DATA: 03/07/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

 PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ITEM		CDIGO	DESCRICAO	FONTE	UND	QNT	CONTRATO		PLANILHA DE MEDICAO				FINANCEIRO		SALDO		%
							PQ UNITARIO	PQ TOTAL	AC ANT	AC AT	AC TOTAL	AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	SALDO		
1		ADMINISTRACAO LOCAL						29.226,60				29.226,60				-	0,00%
1.1		90778	FISCALIZACAO E PROJETOS DA ENGENHARIA	SINAPI	H	120,00	R\$ 115,62	R\$ 13.874,40	120,00		120,00	R\$ 13.874,40	R\$	-	R\$ 13.874,40	R\$	0,00%
1.2		90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	540,00	R\$ 28,43	R\$ 15.352,20	540,00		540,00	R\$ 15.352,20	R\$	-	R\$ 15.352,20	R\$	0,00%
2		DEMOLICOES E REMOÇÕES						2.752,24				2.752,24	R\$	-	R\$ 2.752,24	R\$	0,00%
2.1		5976225	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	ORSE	M3	16,05	R\$ 56,72	R\$ 910,36	16,05		16,05	R\$ 910,36	R\$	-	R\$ 910,36	R\$	0,00%
2.2		5935885	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	ORSE	M3XKM	320,85	R\$ 2,97	R\$ 952,92	320,85		320,85	R\$ 952,92	R\$	-	R\$ 952,92	R\$	0,00%
2.3		98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF_03/2024	SINAPI	M2	192,00	R\$ 4,63	R\$ 888,96	192,00		192,00	R\$ 888,96	R\$	-	R\$ 888,96	R\$	0,00%
3		SERVICOS PRELIMINARES						16.144,13				16.144,13	R\$	-	R\$ 16.144,13	R\$	0,00%
3.1		S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$ 735,00	R\$ 735,00	1,00		1,00	R\$ 735,00	R\$	-	R\$ 735,00	R\$	0,00%
3.2		S04176	LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUCAO DE GARANTO DE MADEIRA	ORSE	M2	220,10	R\$ 6,12	R\$ 1.347,01	220,10		220,10	R\$ 1.347,01	R\$	-	R\$ 1.347,01	R\$	0,00%
3.3		98459	TAPULME COM TELHA METALICA AF_03/2024 - INCLUSO VEDACAO DO BARRACAO	SINAPI	M2	125,00	R\$ 93,92	R\$ 11.740,00	125,00		125,00	R\$ 11.740,00	R\$	-	R\$ 11.740,00	R\$	0,00%
3.4		S11703	BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMACAO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	ORSE	M2	12,00	R\$ 193,51	R\$ 2.322,12	12,00		12,00	R\$ 2.322,12	R\$	-	R\$ 2.322,12	R\$	0,00%
4		MOVIMENTACOES DE TERRA						17.719,22				17.719,22	R\$	-	R\$ 17.719,22	R\$	0,00%
4.1		93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA AF_09/2024	SINAPI	M3	8,25	R\$ 85,52	R\$ 705,54	8,25		8,25	R\$ 705,54	R\$	-	R\$ 705,54	R\$	0,00%
4.2		93358	ESCAVACAO MANUAL DE SAPATAS	SINAPI	M3	121,50	R\$ 85,52	R\$ 10.390,68	121,50		121,50	R\$ 10.390,68	R\$	-	R\$ 10.390,68	R\$	0,00%
4.3		C2821	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL SEINFRA A	M3	86,00	R\$ 22,30	R\$ 1.917,80	R\$ 1.917,80	86,00		86,00	R\$ 1.917,80	R\$	-	R\$ 1.917,80	R\$	0,00%
4.4		94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO AF_08/2023	SINAPI	M3	60,00	R\$ 78,42	R\$ 4.705,20	60,00		60,00	R\$ 4.705,20	R\$	-	R\$ 4.705,20	R\$	0,00%
5		INFRAESTRUTURA						51.807,78				51.807,78	R\$	-	R\$ 51.807,78	R\$	0,03%
5.1		ALCERCE E EMBASAMENTOS						3.349,42				3.349,42	R\$	-	R\$ 3.349,42	R\$	0,04%
5.1.1		C3604	MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TL FURADO, C/ARG. MISTA C/CL. HIDRATADA PARA NIVELAMENTO	SEINFRA A	M3	8,25	R\$ 405,99	R\$ 3.349,42	8,25		8,25	R\$ 3.349,42	R\$	-	R\$ 3.349,42	R\$	0,04%
5.2		SAPATAS ISOLADAS						33.829,77				33.829,77	R\$	-	R\$ 33.829,77	R\$	0,00%
5.2.1		96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORPOMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_01/2024	SINAPI	M2	81,00	R\$ 41,96	R\$ 3.398,76	81,00		81,00	R\$ 3.398,76	R\$	-	R\$ 3.398,76	R\$	0,00%
5.2.2		96546	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	833,00	R\$ 14,55	R\$ 12.120,15	833,00		833,00	R\$ 12.120,15	R\$	-	R\$ 12.120,15	R\$	0,00%
5.2.3		94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	32,40	R\$ 565,15	R\$ 18.310,86	32,40		32,40	R\$ 18.310,86	R\$	-	R\$ 18.310,86	R\$	0,00%
5.3		VIGAS BALDRAME						14.628,56				14.628,56	R\$	-	R\$ 14.628,56	R\$	0,00%
5.3.1		S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISA07/2015	ORSE	M2	80,00	R\$ 45,24	R\$ 3.619,20	80,00		80,00	R\$ 3.619,20	R\$	-	R\$ 3.619,20	R\$	0,00%
5.3.2		92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	146,30	R\$ 14,52	R\$ 2.124,28	146,30		146,30	R\$ 2.124,28	R\$	-	R\$ 2.124,28	R\$	0,00%
5.3.3		92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	231,00	R\$ 13,04	R\$ 3.012,24	231,00		231,00	R\$ 3.012,24	R\$	-	R\$ 3.012,24	R\$	0,00%
5.3.4		94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	5,60	R\$ 565,15	R\$ 3.164,84	5,60		5,60	R\$ 3.164,84	R\$	-	R\$ 3.164,84	R\$	0,00%



[illegible]

6.2.3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15	R\$	565,15	R\$	649,92	1,15				1,15	R\$	649,92	R\$	-	R\$	649,92	-R\$	0,00	0,00%
6.2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	1,15	R\$	292,60	R\$	336,49	1,15				1,15	R\$	336,49	R\$	-	R\$	336,49	R\$	-	0,00%
6.2.3.5	92762	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	46,30	R\$	11,69	R\$	541,25	46,30				46,30	R\$	541,25	R\$	-	R\$	541,25	R\$	0,00	0,00%
6.2.4	VIGAS PLATIBANDAS					R\$	5.150,27							R\$	5.150,27	R\$	-	R\$	5.150,28	-R\$	0,00	0,00%	
6.2.4.1	511657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	31,60	R\$	48,25	R\$	1.461,50	31,60				31,60	R\$	1.461,50	R\$	-	R\$	1.461,50	R\$	-	0,00%
6.2.4.2	92761	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	100,00	R\$	13,04	R\$	1.304,00	100,00				100,00	R\$	1.304,00	R\$	-	R\$	1.304,00	R\$	-	0,00%
6.2.4.3	92759	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	52,00	R\$	14,52	R\$	755,04	52,00				52,00	R\$	755,04	R\$	-	R\$	755,04	R\$	-	0,00%
6.2.4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	1,90	R\$	565,15	R\$	1.073,79	1,90				1,90	R\$	1.073,79	R\$	-	R\$	1.073,80	-R\$	0,00	0,00%
6.2.4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	1,90	R\$	292,60	R\$	555,94	1,90				1,90	R\$	555,94	R\$	-	R\$	555,94	R\$	-	0,00%
6.3	LAJES					R\$	33.786,48							R\$	33.786,48	R\$	-	R\$	33.786,48	R\$	-	0,00%	
6.3.1	5101983	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENÇIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	ORSE	M2	196,00	R\$	172,38	R\$	33.786,48	196,00				196,00	R\$	33.786,48	R\$	-	R\$	33.786,48	R\$	-	0,00%
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$	5.956,92							R\$	5.956,92	R\$	-	R\$	5.956,92	R\$	0,00	0,00%	
6.4.1	106024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM AF_03/2024 - PORTAS CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM AF_03/2024 - JANELAS	SINAPI	M	77,00	R\$	53,78	R\$	4.141,06	77,00				77,00	R\$	4.141,06	R\$	-	R\$	4.141,06	R\$	-	0,00%
6.4.2	106030	CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM AF_03/2024 - JANELAS	SINAPI	M	43,40	R\$	41,84	R\$	1.815,86	43,40				43,40	R\$	1.815,86	R\$	-	R\$	1.815,86	R\$	0,00	0,00%
7	ALVENARIAS E PAINES					R\$	106.114,92							R\$	106.114,92	R\$	-	R\$	106.114,92	R\$	-	0,00%	
7.1	S10333925	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9 CM E ARAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	ORSE	M2	982,00	R\$	108,06	R\$	106.114,92	982,00				982,00	R\$	106.114,92	R\$	-	R\$	106.114,92	R\$	-	0,00%
8	COBERTURA					R\$	66.918,94							R\$	66.918,94	R\$	-	R\$	64.277,15	R\$	2.641,70	3,95%	
8.1	101919	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF_11/2020	SINAPI	M	37,00	R\$	38,98	R\$	1.442,26	37,00				37,00	R\$	1.442,26	R\$	-	R\$	1.442,26	R\$	-	0,00%
8.2	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	M	64,00	R\$	49,59	R\$	3.173,76	64,00				64,00	R\$	3.173,76	R\$	-	R\$	3.173,76	R\$	-	0,00%
8.3	S987145	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 - INSTALAÇÕES FLUVIAIS	ORSE	M	36,00	R\$	34,20	R\$	1.231,20	36,00				36,00	R\$	1.231,20	R\$	-	R\$	1.231,20	R\$	-	0,00%
8.4	C5220	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	2.443,50	R\$	18,11	R\$	46.665,29	2.335,50				2.335,50	R\$	44.621,83	R\$	-	R\$	44.621,83	R\$	2.073,46	4,44%
8.5	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METALICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	181,00	R\$	71,03	R\$	12.856,43	173,00				173,00	R\$	12.288,19	R\$	-	R\$	12.288,19	R\$	568,24	4,42%
8.6	C0661	CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA 26 SEINFRA DESENVOLVIMENTO 50CM	SEINFRA	M	18,30	R\$	83,06	R\$	1.520,00	18,30				18,30	R\$	1.519,91	R\$	-	R\$	1.520,00	R\$	0,00	0,00%
9	SISTEMA DE TRATAMENTO E CAIXAS					R\$	26.650,73							R\$	25.704,50	R\$	0,04	R\$	25.704,63	R\$	946,10	3,55%	
9.1.1	CA925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	R\$	50,34	R\$	402,72	8,00				8,00	R\$	402,68	R\$	-	R\$	402,72	R\$	-	0,00%
9.1.2	CA926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	R\$	53,38	R\$	106,76	2,00				2,00	R\$	106,75	R\$	-	R\$	106,76	R\$	-	0,00%



11.1.1	S91834S	25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 03/2023	ORSE	M	300,00	R\$	16,26	R\$	4.878,00	300,00		300,00	R\$	4.878,00	R\$	-	R\$	4.878,00	R\$	-	0,00%
11.1.2	S91836S	32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 03/2023	ORSE	M	100,00	R\$	19,15	R\$	1.915,00	34,03		34,03	R\$	651,72	R\$	-	R\$	651,72	R\$	1.263,28	65,97%
11.1.3	S91840S	40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	ORSE	M	100,00	R\$	19,69	R\$	1.969,00	100,00		100,00	R\$	1.969,00	R\$	-	R\$	1.969,00	R\$	-	0,00%
11.1.4	S93008S	50 MM (1 1/2") PARA REDE, ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	ORSE	M	54,00	R\$	18,43	R\$	995,22	25,44	5,00	30,44	R\$	488,92	R\$	92,15	R\$	561,07	R\$	434,15	43,62%
11.2	CABOS																				0,00%
11.2.1	S91825S	1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	ORSE	M	310,00	R\$	3,65	R\$	1.131,50	310,00		310,00	R\$	1.131,50	R\$	-	R\$	1.131,50	R\$	-	0,00%
11.2.2	S91826S	2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	ORSE	M	890,00	R\$	4,37	R\$	3.889,30	890,00		890,00	R\$	3.889,30	R\$	-	R\$	3.889,30	R\$	-	0,00%
11.2.3	S91828S	4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	ORSE	M	580,00	R\$	6,78	R\$	3.932,40	580,00		580,00	R\$	3.932,40	R\$	-	R\$	3.932,40	R\$	-	0,00%
11.2.4	101562	25 MM², 0,6/1,0 KV PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	SINAPI	M	54,00	R\$	28,94	R\$	1.562,76	54,00		54,00	R\$	1.562,76	R\$	-	R\$	1.562,76	R\$	-	0,00%
11.3	PONTOS DE TOMADAS E LÓGICA																				0,00%
11.3.1	00007543	4 X 2" - TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE INTERNET E LÓGICA	SINAPI	UN	4,00	R\$	5,97	R\$	23,48	4,00		4,00	R\$	23,48	R\$	-	R\$	23,48	R\$	-	0,00%
11.3.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 11/2022	SINAPI	UN	74,00	R\$	146,51	R\$	10.841,74	74,00		74,00	R\$	10.841,74	R\$	-	R\$	10.841,74	R\$	-	0,00%
11.3.3	104480	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUIVERO) AF 11/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$	142,14	R\$	1.989,96	14,00		14,00	R\$	1.989,96	R\$	-	R\$	1.989,96	R\$	-	0,00%
11.3.4	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 11/2022 (COMBATE A INCÊNDIO)	SINAPI	UN	7,00	R\$	146,51	R\$	1.025,57	7,00		7,00	R\$	1.025,57	R\$	-	R\$	1.025,57	R\$	-	0,00%
11.4	PONTOS DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS																				16,98%
11.4.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 11/2022	SINAPI	UN	44,00	R\$	170,17	R\$	7.487,48	34,00		34,00	R\$	5.785,78	R\$	-	R\$	5.785,78	R\$	1.701,70	22,73%
11.4.2	S13176	24W", 6500K, G. LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	38,00	R\$	60,05	R\$	2.281,90	38,00		38,00	R\$	2.281,90	R\$	-	R\$	2.281,90	R\$	-	0,00%
11.4.3	S97596S	30 LÂMPADAS LED DE 2 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2024	ORSE	UN	7,00	R\$	16,33	R\$	114,31	7,00		7,00	R\$	114,31	R\$	-	R\$	114,31	R\$	-	0,00%
11.4.4	97605	TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$	81,22	R\$	162,44	2,00		2,00	R\$	162,44	R\$	-	R\$	162,44	R\$	-	0,00%

11.4.5	111130	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W	ORSE	UN	4,00	R\$	53,75	R\$	215,00	4,00		4,00	R\$	215,00	R\$	-	0,00%
11.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES							R\$	2.383,98				R\$	2.383,98	R\$	-	0,00%
11.5.1	C-1002	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$	20,40	R\$	81,60	4,00		4,00	R\$	81,60	R\$	-	0,00%
11.5.2	C-1003	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$	20,40	R\$	122,40	6,00		6,00	R\$	122,40	R\$	-	0,00%
11.5.3	C-1005	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	14,00	R\$	20,40	R\$	285,60	14,00		14,00	R\$	285,60	R\$	-	0,00%
11.5.4	C-1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	2,00	R\$	98,96	R\$	197,92	2,00		2,00	R\$	197,92	R\$	-	0,00%
11.5.5	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUIÇO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R\$	85,23	R\$	170,46	2,00		2,00	R\$	170,46	R\$	-	0,00%
11.5.6	S12228	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV.01 03/2022	ORSE	UN	2,00	R\$	647,85	R\$	1.295,70	2,00		2,00	R\$	1.295,70	R\$	-	0,00%
11.5.7	00001002	CAIXA INTERNE EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO COM VISOR EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$	230,30	R\$	230,30	1,00		1,00	R\$	230,30	R\$	-	0,00%
11.6	ATERRAMENTO E SPDA							R\$	877,92				R\$	877,92	R\$	-	0,00%
11.6.1	S03786	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 50x3,00M COM CONECTOR	ORSE	UN	3,00	R\$	122,02	R\$	366,06	3,00		3,00	R\$	366,06	R\$	-	0,00%
11.6.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF - 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$	54,96	R\$	164,58	3,00		3,00	R\$	164,58	R\$	-	0,00%
11.6.3	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM² 0,6/1,0 KV PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 07/2020	SINAPI	M	12,00	R\$	28,94	R\$	347,28	12,00		12,00	R\$	347,28	R\$	-	0,00%
12	REVESTIMENTOS							R\$	83.046,40				R\$	83.046,40	R\$	-	0,00%
12.1	EM ARGAMASSA							R\$	76.464,00				R\$	76.464,00	R\$	-	0,00%
12.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF - 10/2022	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	4,59	R\$	8.262,00	1.800,00		1.800,00	R\$	8.262,00	R\$	-	0,00%
12.1.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 PREPARO MECÂNICO APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF - 03/2024	SINAPI	M2	1.800,00	R\$	37,89	R\$	68.202,00	1.800,00		1.800,00	R\$	68.202,00	R\$	-	0,00%
12.2	CERÂMICOS							R\$	6.582,40				R\$	6.582,40	R\$	-	0,00%
12.2.1	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF - 02/2023, PE - ÁREA LAVÁVEIS	SINAPI	M2	80,00	R\$	82,28	R\$	6.582,40	80,00		80,00	R\$	6.582,40	R\$	-	0,00%
13	PISOS							R\$	73.827,94				R\$	73.827,94	R\$	-	14,58%
13.1	EM GRANULITE							R\$	22.312,79				R\$	22.312,79	R\$	-	5,78%
13.1.1	S1041823	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF - 06/2022	ORSE	M2	153,10	R\$	91,40	R\$	13.993,34	76,55	62,45	139,00	R\$	6.996,67	R\$	5.707,93	9,21%
13.1.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA) BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF - 11/2014	SINAPI	M2	153,10	R\$	54,34	R\$	8.319,45	153,10		153,10	R\$	8.319,45	R\$	-	0,00%
13.2	CERÂMICOS							R\$	5.231,60				R\$	5.231,60	R\$	-	0,00%
13.2.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA) BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF - 11/2014	SINAPI	M2	40,00	R\$	54,34	R\$	2.173,60	40,00		40,00	R\$	2.173,60	R\$	-	0,00%

13.2.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	40,00	R\$	76,45	R\$	3.058,00	40,00			40,00				R\$	3.058,00	R\$	-	0,00%	
13.3		PORELANOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	SINAPI	M2	180,00	R\$	54,34	R\$	9.781,20	153,00	12,50	165,50	165,50	R\$	8.314,02	R\$	23.629,14	R\$	31.943,16	R\$	2.798,65	8,06%
13.3.1	94439	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	180,00	R\$	138,67	R\$	24.960,60	0,00	165,50	165,50	165,50	R\$	-	R\$	22.949,89	R\$	22.949,89	R\$	2.010,72	8,06%
13.3.2	87263	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESALTADA DE DIMENSÕES 60X80CM. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	180,00	R\$	138,67	R\$	24.960,60	0,00	165,50	165,50	165,50	R\$	-	R\$	22.949,89	R\$	22.949,89	R\$	2.010,72	8,06%
13.4		RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESALTADA DE DIMENSÕES 60X80CM. AF_02/2023 PE																				
13.4.1	S88605	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESALTADA DE DIMENSÕES 60X80CM. AF_02/2023	ORSE	M	335,50	R\$	11,20	R\$	3.757,60	0,00	167,75	167,75	167,75	R\$	-	R\$	1.878,80	R\$	1.878,80	R\$	1.878,80	50,00%
13.5		EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022																				
13.5.1	S94983	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	ORSE	M2	105,00	R\$	72,23	R\$	7.584,15	0,00	39,00	39,00	39,00	R\$	-	R\$	2.816,97	R\$	2.816,97	R\$	4.767,18	62,86%
14		FORROS																				
14.1	98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	350,00	R\$	48,26	R\$	16.891,00	317,00		317,00	317,00	R\$	15.298,42	R\$	-	R\$	15.298,42	R\$	1.592,58	9,43%
15		PINTURA INTERNA																				
15.1	PINTURA	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	ORSE	M2	1.165,00	R\$	3,61	R\$	4.205,65	1.165,00		1.165,00	1.165,00	R\$	4.205,65	R\$	-	R\$	4.205,65	R\$	-	0,00%
15.1.1	S88415S	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	15,92	R\$	18.546,80	815,00	350,00	1.165,00	1.165,00	R\$	12.974,80	R\$	5.572,00	R\$	18.546,80	R\$	-	0,00%
15.1.2	S88497S	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	13,20	R\$	15.378,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	R\$	-	R\$	15.378,00	R\$	15.378,00	R\$	-	0,00%
15.1.3	S88480S	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_04/2023	ORSE	M2	1.165,00	R\$	12,193,25	R\$	12.193,25					R\$	6.096,63	R\$	6.096,63	R\$	12.193,25	R\$	-	0,00%
15.2		PINTURA EXTERNA																				
15.2.1	S88415S	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VIOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	ORSE	M2	475,00	R\$	3,61	R\$	1.714,75	237,50	237,50	475,00	475,00	R\$	857,38	R\$	857,38	R\$	1.714,75	R\$	-	0,00%
15.2.2	88417	TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VIOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	475,00	R\$	22,06	R\$	10.478,50	237,50	237,50	475,00	475,00	R\$	5.239,25	R\$	5.239,25	R\$	10.478,50	R\$	-	0,00%
15.3		FORROS																				
15.3.1	S88480S	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL. EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	ORSE	M2	350,00	R\$	13,20	R\$	4.620,00	317,00		317,00	317,00	R\$	4.184,40	R\$	-	R\$	4.184,40	R\$	435,60	9,43%
16		ESQUADRIAS																				
16.1	PORTAS	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (PRESADA OU SUPERFACIADA), PADRÃO MÊDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$	1.467,87	R\$	22.018,05	0,00		0,00	0,00	R\$	2.759,63	R\$	14.126,79	R\$	16.886,42	R\$	61.522,45	78,46%
16.1.1	90945	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (PRESADA OU SUPERFACIADA), PADRÃO MÊDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00	R\$	1.467,87	R\$	22.018,05	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.018,05	100,00%
16.1.2	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVÊ OU MÊDIA), PADRÃO MÊDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$	1.112,28	R\$	6.673,68	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.673,68	100,00%
16.1.3	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVÊ OU MÊDIA), PADRÃO MÊDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$	1.143,71	R\$	1.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.143,71	100,00%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico para 7ª medição realizada "in loco" da Construção da Secretaria de Infraestrutura, no município Chapadinho - MA, 65500-000.

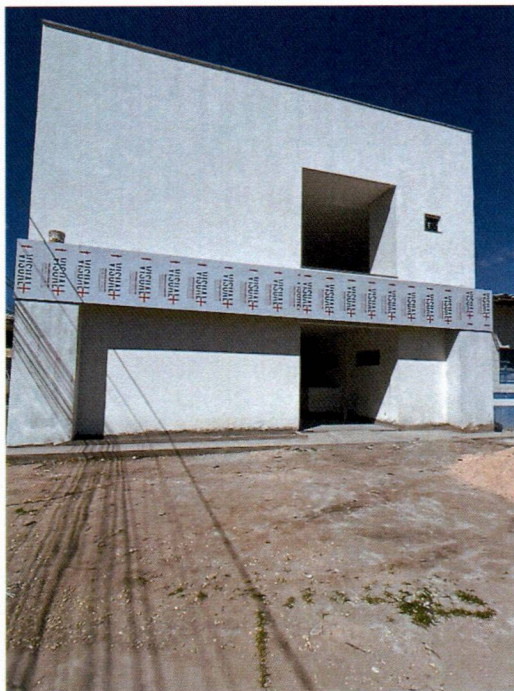


Imagem 1 – Montagem do ACM, execução de calçadas, pinturas externas e instalações de esquadrias;

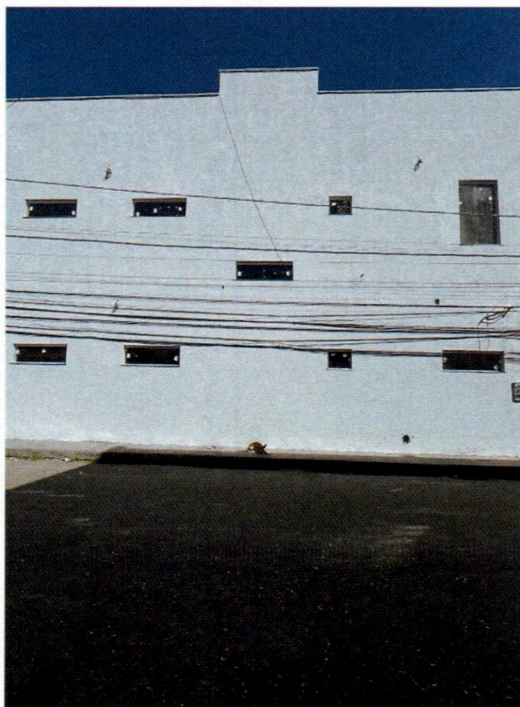


Imagem 2 – Execução de calçadas, pinturas externas e instalações de esquadrias;



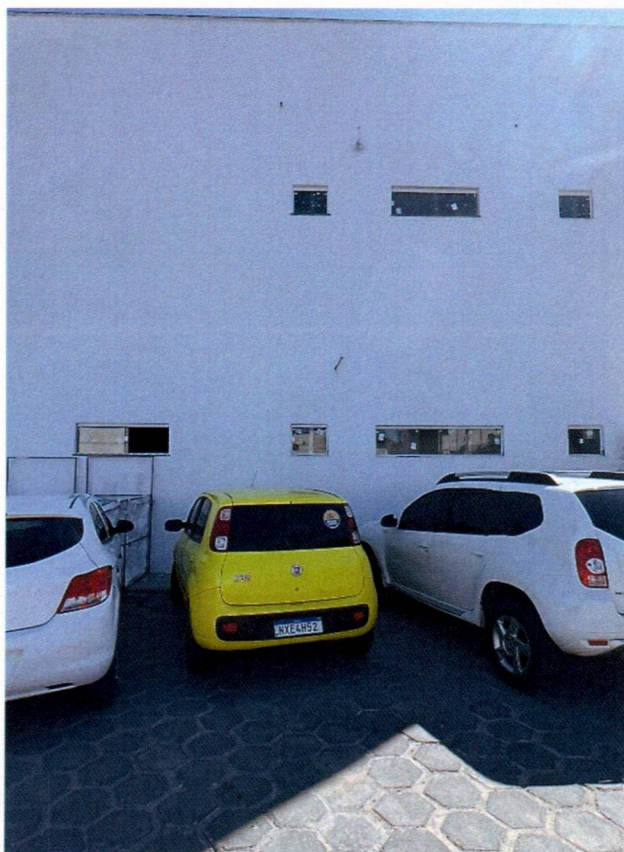


Imagem 3 – Execução das pinturas/texturas e esquadrias;



Imagem 4 – Execução de esquadrias;



Imagem 5 – Execução de granilite e rodapés;



Imagem 6 – Execução de granilite, rodapé e esquadrias;

[Handwritten signature]

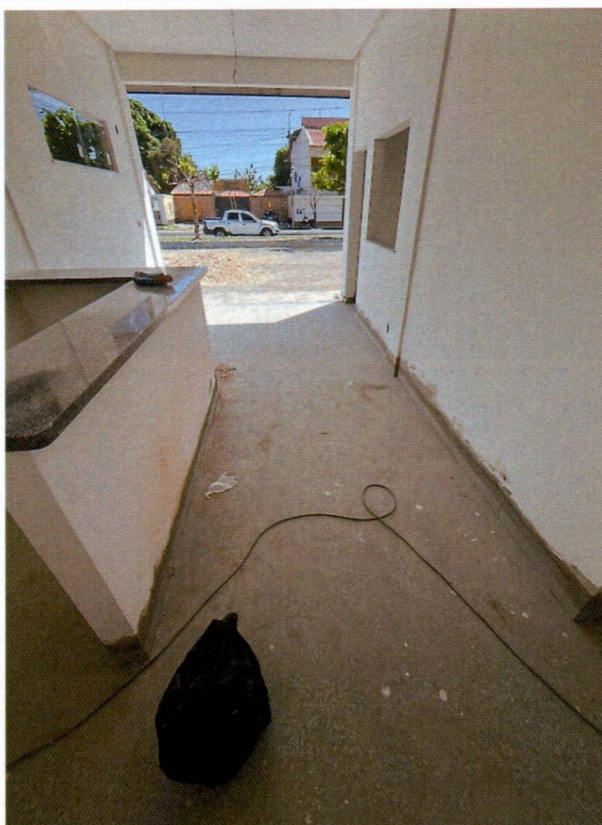


Imagem 7 – Execução de granilite e rodapés;



Imagem 8 – Execução de granilite e rodapés;

[Handwritten signature]



Imagem 9 – Execução de granilite e rodapés;



Imagem 10 – Execução de granilite e rodapés;

[Handwritten signature]



Imagem 11 – Execução de granilite e rodapés;

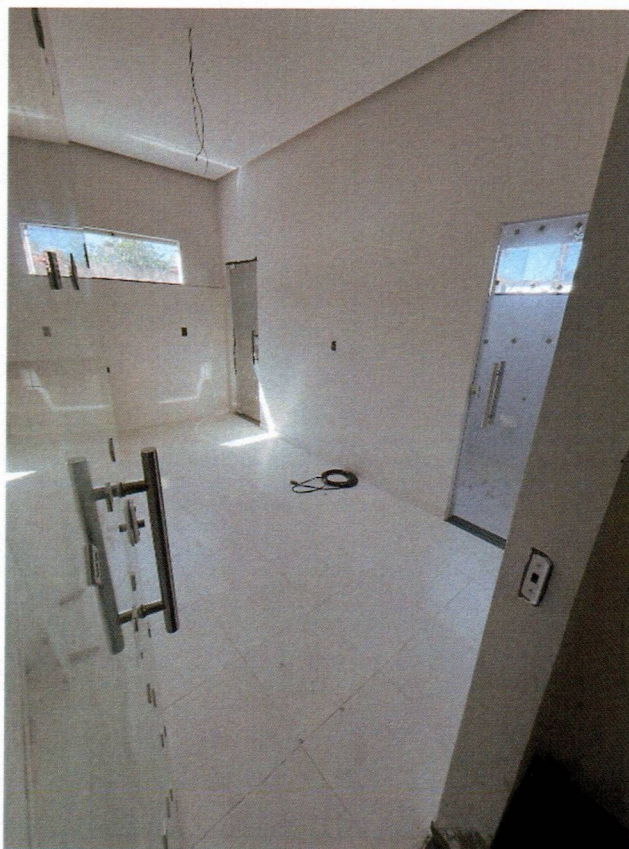


Imagem 12 – Execução de esquadrias;

[Handwritten signature]



Imagem 13 – Execução de esquadrias, louças, metais e pisos porcelanatos;



Imagem 14 – Execução de porcelanato e esquadrias;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.



Imagem 15 – Execução de esquadrias, louças, metais e pisos porcelanatos;



Imagem 16 – Execução de porcelanato e esquadrias;

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Imagem 17 – Execução de porcelanato, esquadrias, louças e metais;

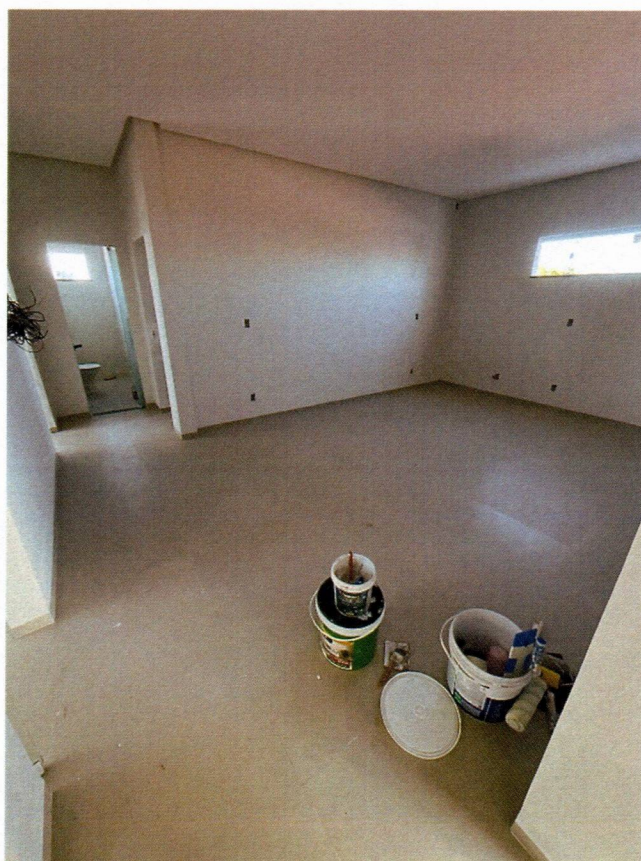


Imagem 18 – Execução de porcelanato e esquadrias;

(Handwritten signature)

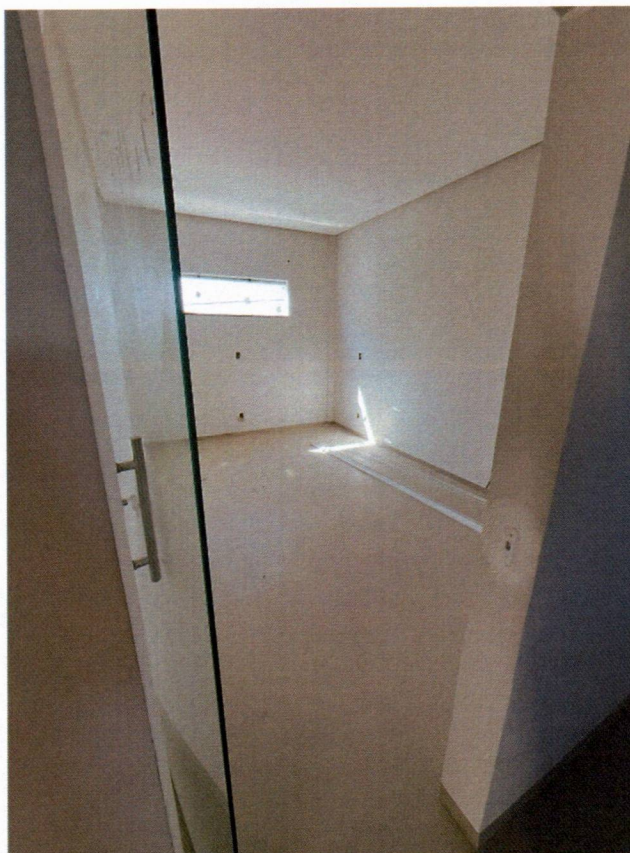


Imagem 19 – Execução de porcelanatos e esquadrias;



Imagem 20 – Execução de esquadrias, louças e metais;

Handwritten signature or mark in blue ink.

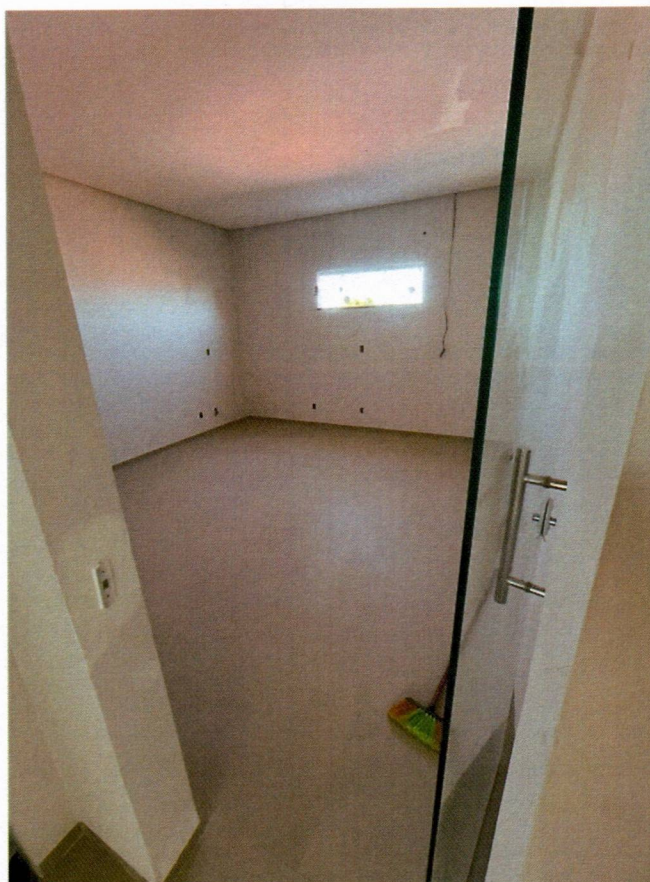


Imagem 21 – Execução de porcelanatos e esquadrias;



Imagem 22 – Execução de porcelanatos e esquadrias.

Wéverton Thailys Matos Almeida
Engenheiro Civil
CREA - MA/112120222-5

A Sra.
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócio proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 124.832,56** (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) referente a construção da secretaria de obras de Chapadinha MA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 08 de JULHO de 2026

THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:84521465315
5315


Assinado de forma
digital por THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.07.08
09:18:00 -03'00'

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000090	 CERTIFICADO 1020260092110000															
	Data e Hora da Emissão 08/07/2026 08:56:48																
	Competência da NFS-e 07/2026																
	Código de Verificação 70F0.2B9C.AB18.9D18.7EBA.E1B9.5C8A.1011																
Chave de Acesso da NFS-e 2111300120051323300019800000000009026073316710810																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF / CNPJ: 00.513.233/0001-98 Inscrição Municipal: 550000 Endereço: R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE, 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: Município: SAO LUIS UF: MA Email: direcao@idealconstrutorama. Telefone: (98) 88373415																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 Inscrição Municipal: Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 310 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000 Município: CHAPADINHA UF: MA Email: nickmacklewre@gmail.com Telefone: (98) 91660182																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SETIMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CHAPADINHA MA. CONTRATO 225/2024. AGENCIA 4323 - 0 CONTA: 50.835 - 7 BANCO DO BRASIL																	
<table><thead><tr><th>Tipo do Item</th><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário (R\$)</th><th>Valor Total (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>VALOR DOS SERVIÇOS.</td><td>1</td><td>74.899,54</td><td>74.899,54</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.</td><td>1</td><td>49.933,02</td><td>49.933,02</td></tr></tbody></table>	Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	74.899,54	74.899,54	TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	49.933,02	49.933,02		
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)													
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	74.899,54	74.899,54													
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	49.933,02	49.933,02													
<table><tr><td>PIS (0,00%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,2000%): R\$ 1.497,99</td></tr><tr><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00</td><td>IBS ESTADUAL (0,05%): R\$ 59,30</td><td>CBS (0,45%): R\$ 533,66</td></tr></table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 1.497,99	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,05%): R\$ 59,30	CBS (0,45%): R\$ 533,66					
PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 1.497,99														
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,05%): R\$ 59,30	CBS (0,45%): R\$ 533,66														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.832,56																	
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 124.832,56	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 6.241,63													
OUTRAS INFORMAÇÕES Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA Recolhimento: RETIDO Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS NBS: 101056000 - Serviços de alvenaria Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, Mês de ATESTO QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM <u>08</u> / <u>07</u> / <u>2026</u> Wéverton Thalys Matos Almeida Engenheiro Civil CREA - MA 112120222-4  A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e																	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.513.233/0001-98

Certidão nº: 9922119/2026

Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21

Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2026 a 11/07/2026

Certificação Número: 2026061201030036292064

Informação obtida em 17/06/2026 14:25:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056716/26

Data da

03/06/2026 10:57:42

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 14:27:53



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 138472/26

Data da

03/06/2026 10:56:16

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 14:26:47



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014117912026

Validade: 02/01/2027

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento:
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de julho de 2026 as 14:00**, sob o código de autenticidade nº **CED6485EB1F6AABC0C0D9D0D2D636986**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
